





Conjunt de l'Ajuntament

Accions	Nombre	%
Planificades:	205	
Cancel·lades:	1	0,49%
Programades i no cancel·lades	170	82,93%
Iniciades:	144	84,71%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	26	15,29%
Avançades a l'inici programat	5	2,44%
Completades a 30/06/2025	17	10,00%

Estat d'execució a 30/06/2025		
Previst	Real	Situació
41,93% 	32,80% 	

1000	Alcaldia
-------------	-----------------


Accions	Nombre	%
Planificades:	21	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	15	71,43%
Iniciades:	14	93,33%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	1	6,67%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	2	13,33%

Estat d'execució a 30/06/2025		
Previst	Real	Situació
37,71% 	36,38% 	

33210

Biblioteca municipal 'Joan Coromines'

Accions	Nombre	%
Planificades:	2	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	2	100,00%
Iniciades:	2	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

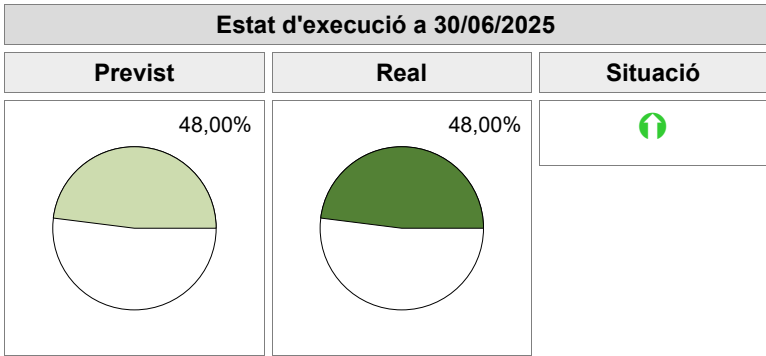

ODS vinculats:




			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
039	Potenciar, d'acord amb les possibilitats de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, instruments de suport a la lectura amb persones amb dificultats cognitives, auditives o visuals.	L'acció s'està executant amb normalitat, emprant recursos de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres.	09/2023	06/2027	09/2023		48%	48%		☐
111	Impulsar iniciatives per al foment de la lectura en català des de la Biblioteca, en el marc del Pla Nacional de la Lectura.	L'acció es desenvolupa d'acord amb allò previst.	09/2023	06/2027	09/2023		48%	48%		☐

33220

Arxiu municipal

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

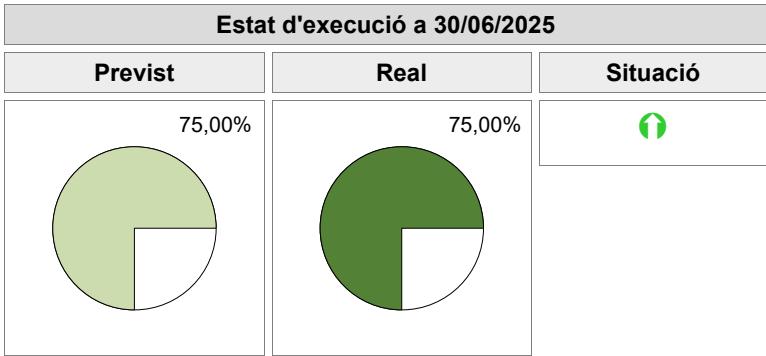


ODS vinculats:



Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
115	Millorar les instal·lacions de l'Arxiu municipal (WiFi, il·luminació...).	Es preveu completar l'acció durant l'any 2025.	01/2024	12/2025	01/2024		75%	75%	↑	☐

33300 Equipaments culturals i museu.

Accions	Nombre	%
Planificades:	4	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	2	50,00%
Iniciades:	2	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

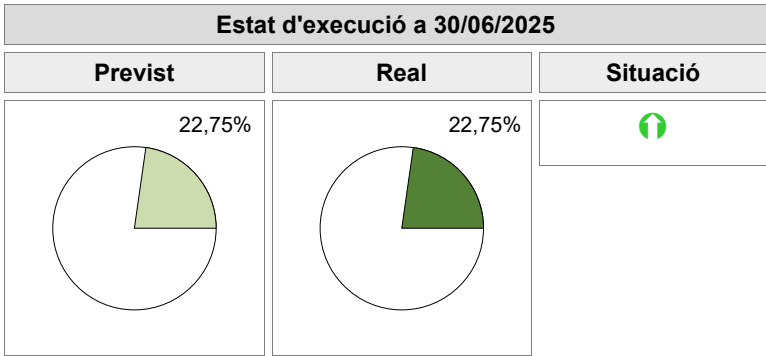

ODS vinculats:




Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
108	Culminar el projecte de recuperació global de l'espai de «La Fabriqueta».	L'acció es desenvolupa segons el previst. Actualment, s'ha dut a terme el buidatge de l'espai i s'estan realitzant els tractaments pertinents per la correcta conservació de l'estructura original de l'edifici.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	43%	↑	☐
112	Continuar la negociació per a la rehabilitació del Teatre del Casino.	L'inici de l'acció és previst per l'any 2026.	01/2026	06/2027			0%	0%	○	☐
113	Fer un mapa de l'estat i de les necessitats en relació amb la creació, la programació i la difusió cultural al municipi.	L'inici de l'acció és previst per gener de 2026. Amb tot, s'han realitzat algunes actuacions prèvies: • El març de 2025 s'ha posat en marxa un nou canal de difusió de WhatsApp d'activitats culturals del municipi. • El juliol de 2025, s'ha elaborat un cens d'artistes vinculats amb el municipi en actiu per convidar-los a l'exposició col·lectiva "Visions artístiques. Dos-cents anys de la vila". S'ha produït l'exposició per difondre l'obra de 64 artistes.	01/2026	12/2026			0%	0%	○	☐

Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
125	Fer sengles projectes d'impuls i visibilitat de l'Espai d'art cinètic «Jordi Pericot» i de l'Espai escènic «Iago Pericot».	Durant l'any 2025, ha continuat la temporada estable de l'Espai Escènic Iago Pericot. L'octubre de 2024 es va inaugurar un espai expositiu de divulgació al voltant de l'obra i la trajectòria de Iago Pericot al vestíbul del teatre. Pel que fa a l'Espai d'Art Cinètic Jordi Pericot: • S'ha tramitat el préstec temporal de l'obra MeRdA de Jordi Pericot exposada a l'Espai d'Art Cinètic Jordi Pericot per a l'exposició temporal que tindrà lloc a la galeria Bauboo amb motiu del Bicentenari del Masnou, del 14 de juliol al 18 d'agost de 2025. • S'ha suggerit fer servir l'obra artística de Jordi Pericot (especialment de l'època La tensió entre ésser i buit. Formes, colors i buits (1971-1974) per a l'animació i modelat 3D de l'edifici on es projectarà el màping del Bicentenari del Masnou.	09/2023	06/2027	09/2023		48%	48%		☐

33411

Festivals artístics i culturals.

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

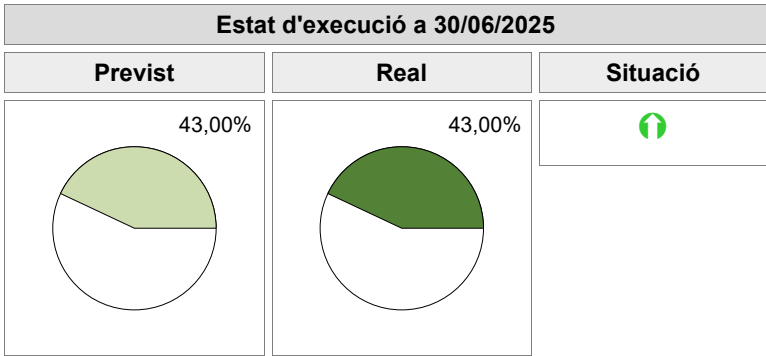

ODS vinculats:




Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
114	Crear una programació cultural fora dels espais tancats, en espais a l'aire lliure com són el parc Vallmora i altres zones verdes o els carrers per a vianants.	Durant l'any 2025 el projecte ha tingut continuïtat i s'ha executat amb normalitat i dins el previst.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	43%		☐

33412

Arts escèniques.

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

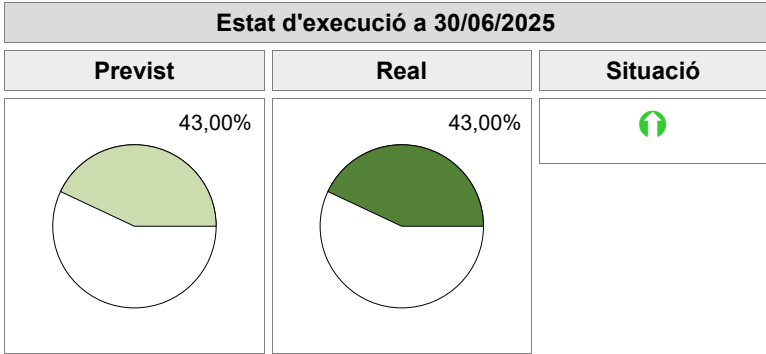

ODS vinculats:




Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
124	Potenciar les residències artístiques a través de la sala B de Ca n'Humet, dedicant aquesta sala a l'Espai Jove quan no se n'ocupi.	Durant el 2025 han continuat les residències de professionals i companyies de teatre. L'octubre de 2024 es va fer una nova edició de la Biennal Iago Pericot amb la participació de cinc companyies i professionals. Al Festival Ple de Riure 2025 es va fer un assaig en obert d'un dels espectacles assajats a la Sala B, amb l'assistència de més de 200 persones.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	43%	↑	☐

33611

Protecció i gestió del patrimoni històric i artístic.

Accions	Nombre	%
Planificades:	5	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	3	60,00%
Iniciades:	3	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

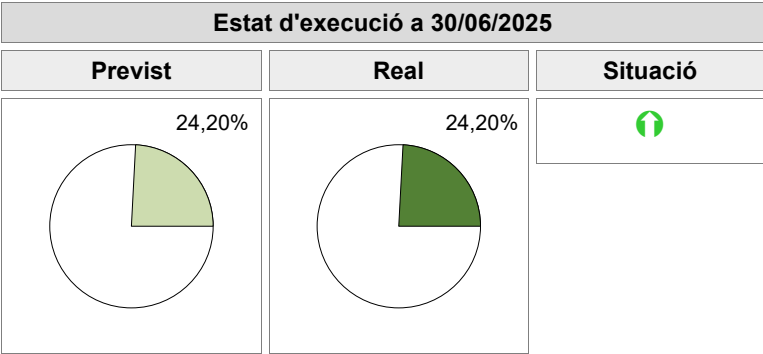

ODS vinculats:




			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
116	Dur a terme reconeixements a persones i entitats que promoguin la memòria històrica i la identitat del municipi.	L'acció s'executa segons allò previst.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	43%		☐
117	Elaborar un cens de víctimes i victimaris de la guerra d'Espanya i de la dictadura franquista.	L'inici de l'acció és previst per gener de 2026.	01/2026	06/2027			0%	0%		☐
118	Treballar per establir el Centre d'Estudis Històrics Locals a l'Arxiu Municipal.	Acció pendent d'iniciar-se l'any 2026.	01/2026	06/2027			0%	0%		☐
119	Impulsar espais de recuperació de la memòria històrica, en especial del paper de les dones.	Per 2025 es preveien les actuacions següents: • Fer una valoració del mobiliari a conservar de La Fabriqueta, per tal de crear un racó museogràfic en el futur equipament. • Elaborar els textos per a l'exposició "El Masnou. 200 anys d'història" en el marc del Bicentenari. • Preparar les visites d'escoles a l'Arxiu, on algunes treballaran la recerca d'espais de memòria o la importància de les dones en la història local. • Gestionar el trasllat de l'exposició temporal "Dones destacades del Masnou", produïda per l'Arxiu i el Museu, a l'Escola Bergantí. Les quatre han estat executades. A més, s'està treballant en: • Assessorament històric i documentació del màping del Bicentenari. • Producció dels roll-up de l'exposició "El Masnou, 200 anys d'història" per tal d'oferir-lo a les escoles durant el proper curs escolar: 2025-2026.	09/2024	12/2026	09/2024		35%	35%		☐

Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
128	Potenciar els itineraris guiats vinculats al coneixement del patrimoni arquitectònic, històric, cultural i ambiental del Masnou.	L'acció s'ha desenvolupat d'acord amb allò previst. S'està executant amb normalitat el programa de visites guiades i itineraris "Descobreix el Masnou" 2025. Només s'han hagut de cancel·lar un parell d'activitats per manca d'inscrits. Durant el 2025 s'ha implantat la nova unitat didàctica adreçada a escoles "Descobreix la subhasta cantada de peix". S'han fet dues activitats al juny (3 i 5) i ja hi ha dues reserves de cara al març del 2026. S'està treballant per tal de poder oferir una nova activitat en un tram de la mina Cresta destinada a un públic aventurer. Proba pilot: Jornada de portes obertes a eixides i safareigs del Masnou 2025 (12 d'octubre).	01/2024	06/2027	01/2024		43%	43%		☐

92200

Coordinació i organització institucional de les entitats locals.

Accions	Nombre	%
Planificades:	2	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	2	100,00%
Iniciades:	2	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	1	50,00%

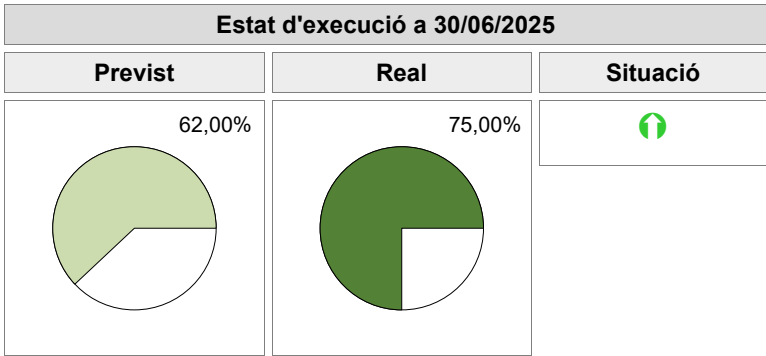

ODS vinculats:




			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
101	Estudiar l'impacte que tindria al Masnou la inclusió del municipi a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).	En data 19 de maig de 2025 es va signar un "Informe preliminar relatiu a l'impacte econòmic que suposaria per al municipi l'ingrés del Masnou a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i al procés a seguir per aquesta incorporació", elaborat pel Gerent municipal, el qual ha estat lliurat a l'Alcaldia.	01/2025	12/2025	01/2025	06/2025	49%	100%		☐
156	Elaborar un pla estratègic per a la consecució de l'agenda urbana 2030.	No s'han produït canvis respecte de la situació a 31/12/2024.	01/2024	12/2025	01/2024		75%	50%		☐

92410

Participació ciutadana.

Accions	Nombre	%
Planificades:	2	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	50,00%
Iniciades:	0	0,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	1	100,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

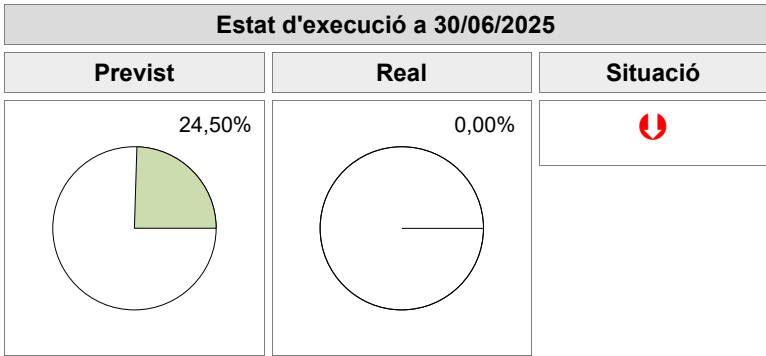

ODS vinculats:




			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
157	Implantar la figura del regidor o regidora i dels consells de barri.	L'inici de l'acció és programat per al segon semestre de 2025.	09/2025	06/2027			0%	0%		☐
158	Realitzar un procés participatiu entre tota la ciutadania per tal de definir els usos i els elements de l'actual pati del Casino perquè esdevingui la plaça de la Vila.	L'acció no s'ha pogut iniciar perquè es troba subjecta a una resolució judicial sobre el litigi de l'expropiació. No es preveu que es pugui dur a terme durant el 2025.	01/2025	12/2025			49%	0%		☐

92510

Comunicació i informació general a la ciutadania.

Accions	Nombre	%
Planificades:	3	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	2	66,67%
Iniciades:	2	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	1	50,00%

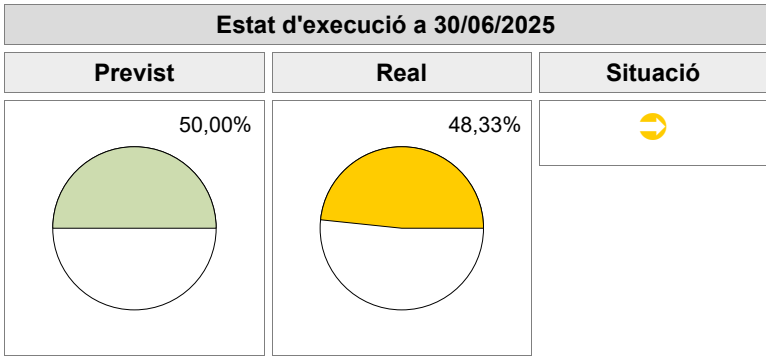


ODS vinculats:



			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
159	Millorar la visualització de l'agenda pública de l'equip de govern.	L'acció es va completar d'acord amb les previsions.	09/2023	12/2023	09/2023	12/2023	100%	100%		☐
199	Modernitzar el lloc web de l'Ajuntament.	Durant el primer semestre de 2025 s'ha treballat en la preparació de la licitació del contracte d'elaboració del nou web, que es preveu que s'aprovi durant l'any. Amb tot, l'adjudicació del contracte i la posta en marxa serà dins de l'any 2026.	01/2024	12/2026	11/2024		50%	45%		☐
200	Elaborar un estudi per a la creació d'un mitjà de comunicació digital.	L'inici de l'acció és planificat per gener de 2026.	01/2026	12/2026			0%	0%		☐

2032	Modernització i atenció ciutadana
-------------	--


Accions	Nombre	%
Planificades:	5	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	5	100,00%
Iniciades:	5	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

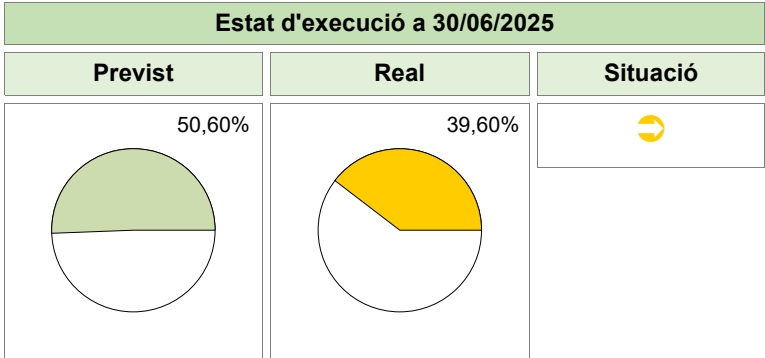

49100

Societat de la informació.

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

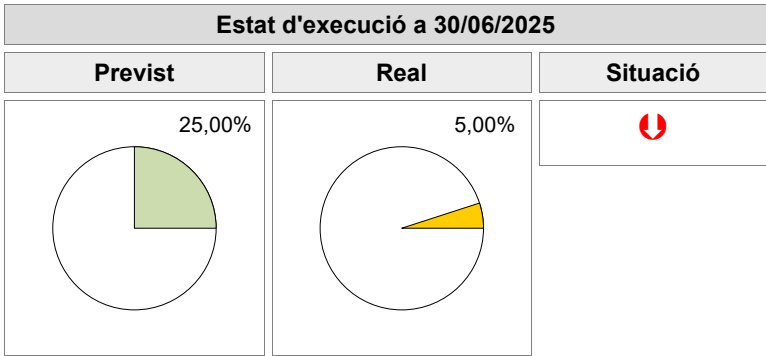

ODS vinculats:




Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
204	Estendre les zones WiFi en espais públics.	S'ha realitzat una prova pilot a l'Edifici Centre que està donant bons resultats, tot i que cal depurar algunes funcionalitats. No hi ha consignació pressupostària per 2025. L'execució de l'acció s'allargarà, ja que la primera fase es preveu per 2026 i la segona al 2027. S'ajusta en aquest sentit la previsió de despeses.	01/2025	12/2026	01/2025		25%	5%		☐

92000

Serveis generals.

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

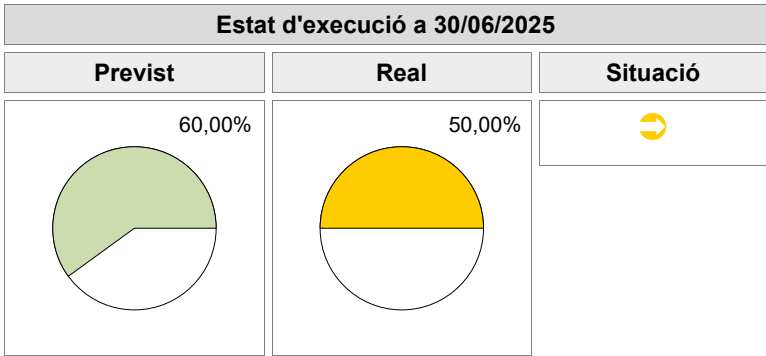

ODS vinculats:




Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
197	Crear una oficina central de dades que reculli tota la informació possible per a la millora dels serveis i per crear nous projectes amb visió estratègica.	Durant l'any 2025 s'ha posat en funcionament l'Oficina de Governança de Dades de l'Ajuntament. Actualment, i fins culminar l'acció, s'està en la fase d'implantació. S'ha completat el catàleg de dades de l'Ajuntament i s'està treballant amb una consultora externa l'anàlisi de les infraestructures físiques i lògiques necessàries per a preveure les inversions necessàries en el pressupost 2026. Igualment, s'han realitzat diverses proves inicials amb anàlisi i explotació de dades municipals i s'ha reactivat la utilització del sistema d'informació geogràfica (SIG) vinculat a dades. Es preveu que l'acció es completarà dins dels terminis previstos.	01/2024	06/2026	01/2024		60%	50%		☐

92500

Oficina d'atenció ciutadana (OAC).

Accions	Nombre	%
Planificades:	3	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	3	100,00%
Iniciades:	3	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

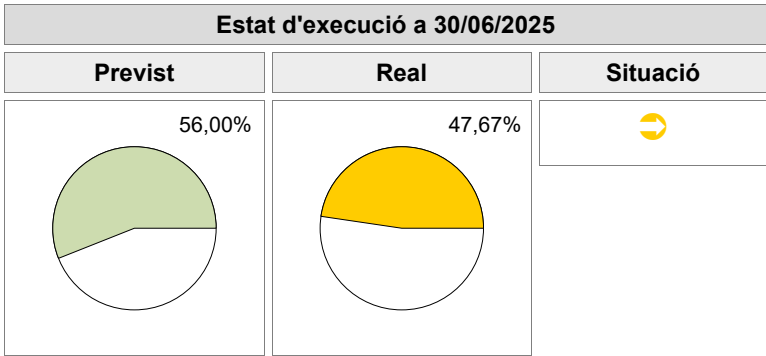



ODS vinculats:



			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
201	Augmentar i millorar els tràmits telemàtics (telèfon, en línia i vídeo tràmit), tot i reforçant l'atenció presencial i personal.	L'execució de l'acció segueix les previsions. Des d'inicis de l'any 2025 s'està treballant amb les integracions de programes, la contractació del TPV per pagaments i els tràmits que s'hauran d'activar. Aquesta tasca no estarà finalitzada fins a setembre/octubre. Es preveu que l'activació de l'app es podrà fer dins l'últim trimestre d'aquest any 2025.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	43%		☐
202	Crear una nova Oficina d'Atenció Ciutadana a la plaça Nova de les Dones del Tèxtil.	Durant el primer semestre de 2025 s'ha treballat en les necessitats de l'ORGT i les adaptacions dels espais comuns amb l'OAC. Es preveu que la contractació del projecte adaptat i l'execució de l'obra interior es farà durant l'any 2026.	01/2025	12/2026	09/2024		25%	25%		☐
205	Revisar el protocol d'acollida al municipi amb tots els serveis de l'Ajuntament i les entitats vinculades.	Durant 2025 s'ha treballat en el protocol, però l'acabament s'ha endarrerit al darrer trimestre de l'any, en què es preveu que estigui enllestit.	01/2024	06/2025	01/2024		100%	75%		☐

2040	Seguretat ciutadana
-------------	----------------------------


Accions	Nombre	%
Planificades:	8	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	7	87,50%
Iniciades:	7	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	1	14,29%

Estat d'execució a 30/06/2025		
Previst	Real	Situació
38,88% 	46,00% 	

13200

Polícia local

Accions	Nombre	%
Planificades:	6	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	5	83,33%
Iniciades:	5	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	1	20,00%

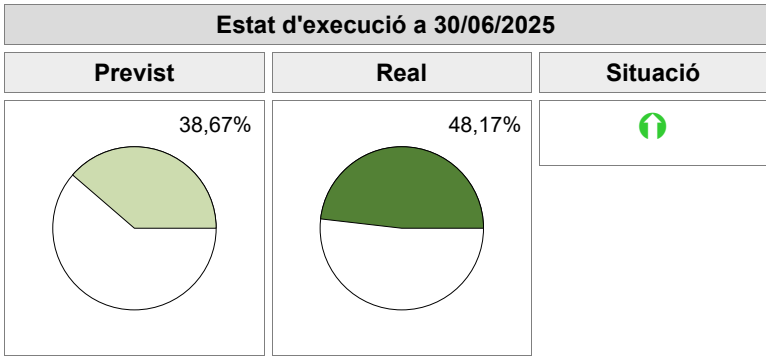

ODS vinculats:




			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
040	Incrementar la presència de dones en el cos de la Policia Local.	Les darreres places han estat cobertes a través del Consell Comarcal i no hi ha possibilitat de reservar places per a dones.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	43%		☐
168	Potenciar la figura dels agents cívics i incrementar-ne el seu nombre.	Des de l'Ajuntament es continua considerant la figura de l'agent cívic com una peça clau de suport a les polítiques de seguretat i civisme.	09/2023	06/2027	09/2023		48%	48%		☐
169	Impulsar la mediació com a mitjà per a la resolució de conflictes veïnals.	Des de l'àmbit de la Policia Local s'està treballant en el desenvolupament d'una àrea funcional de relacions amb la comunitat que tindrà assignades específicament aquestes funcions de mediació.	09/2023	06/2027	09/2023		48%	48%		☐
170	Millorar el parc de vehicles de dues rodes de la policia municipal.	L'acció s'ha completat en 2024.	01/2024	06/2027	01/2024	12/2024	43%	100%		☐
171	Estudiar la viabilitat de la instal·lació de càmeres a l'entrada i sortida del municipi perquè puguin detectar possibles amenaces per la població.	L'inici de l'acció és previst per al gener de 2026. Amb tot, es preveu que l'estudi de viabilitat es pugui avançar al darrer trimestre de 2025.	01/2026	12/2026			0%	0%		☐
172	Estudiar i implantar progressivament tecnologies de la informació i la comunicació a l'àmbit de la seguretat ciutadana.	Per reforçar aquesta acció s'han adquirit quatre tauletes informàtiques per tal que els agents puguin fer les seves funcions directament des del carrer i així millorar l'eficiència en el servei.	01/2024	12/2026	01/2024		50%	50%		☐

13400

Mobilitat urbana

Accions	Nombre	%
Planificades:	2	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	2	100,00%
Iniciades:	2	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

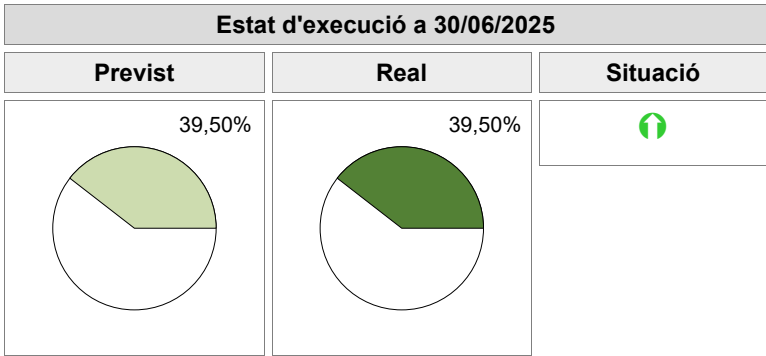

ODS vinculats:















			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
093	Vetllar per un correcte ús dels vials per part de vianants, bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal (VMP).	L'ordenança municipal de circulació és gairebé enllestida i es preveu que es pugui aprovar en els propers mesos.	09/2024	05/2027	09/2024		30%	30%		☐
189	Estudiar la necessitat de crear àrees d'estacionament per a motocicletes i regular el seu ús, durant l'època estival.	Aquesta acció no depen únicament de la Policia Local, i per això s'està tractant al si de la Comissió de Via Pública, amb la resta de departaments implicats. El departament de Mobilitat ha un estudi al respecte, en el qual es determina on es poden posar més places.	01/2025	12/2025	01/2025		49%	49%		☐

2051	Promoció econòmica i turisme
-------------	-------------------------------------


Accions	Nombre	%
Planificades:	9	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	8	88,89%
Iniciades:	8	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	1	12,50%

Estat d'execució a 30/06/2025		
Previst	Real	Situació
42,33% 	43,78% 	

43120

Mercats

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	1	100,00%

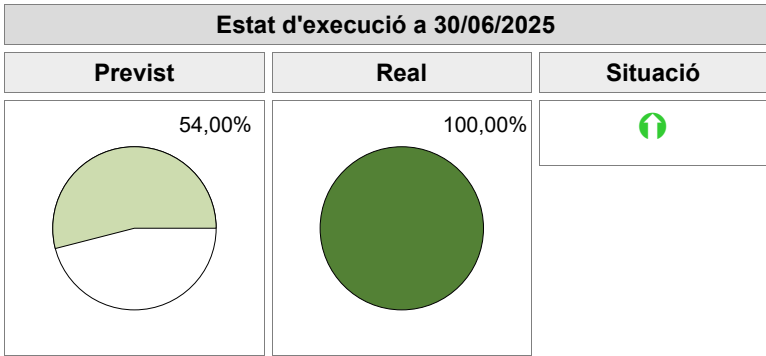

ODS vinculats:




Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
154	Impulsar la creació d'un espai gastronòmic dins del Mercat Municipal.	Aquesta acció s'ha executat al 100%. En endavant l'Ajuntament acompanyarà a l'Associació de Venedors del Mercat Municipal en la conceptualització d'activitats que dinamitzin el punt gastronòmic, però el finançament municipal per aquest concepte finalitza el mes de juliol de 2025. Enguany s'ha rebut una subvenció de 14.000 euros de la DIBA pel desenvolupament d'aquest projecte.	01/2024	09/2026	01/2024	06/2025	54%	100%		☐

43300

Desenvolupament empresarial.

Accions	Nombre	%
Planificades:	8	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	7	87,50%
Iniciades:	7	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

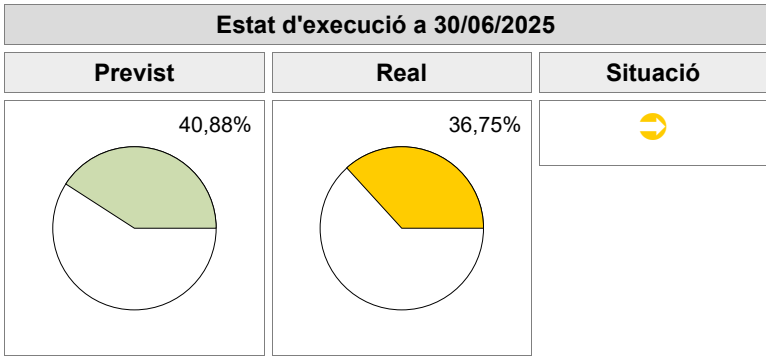

ODS vinculats:





			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
144	Crear un HUB tecnològic per atreure activitat econòmica i crear ocupació de qualitat.	La Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció per a la realització d'un estudi sobre aquest projecte, per import de 8.538,00 € (anualitats 2025 i 2026), amb un cofinançament municipal del 40%. Es previst que la consultoria es contracti el darrer trimestre del 2025 i que l'estudi es porti a terme entre aquest període i el 2026.	01/2025	06/2027	01/2025		20%	20%		☐
147	Impulsar una Oficina d'Atenció a l'Empresa com a concreció de la finestra única empresarial (FUE).	L'acció s'inicia el setembre de 2025.	09/2025	06/2027			0%	0%		☐
148	Incloure dins les jornades d'emprenedoria formacions adreçades específicament a fomentar el cooperativisme i la creació d'empreses d'economia social.	Per al segon semestre de 2025 es planteja realitzar una activitat de cooperativisme juntament amb el programa CuEmE, en el període setembre/desembre de 2025.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	35%		☐
149	Renovar la il·luminació de Nadal, especialment la dels trams de carrers que formin part d'eixos comercials.	Durant l'any 2024 s'han fet inversions en la línia del que indica aquesta acció. Inicialment, es destinaran a millorar la il·luminació nadalenca del Camí Ral. Al 2026 es tornarà a adquirir més material per continuar adequant el municipi en les zones i carrers que es decideixin conjuntament amb la regidoria de Manteniment.	01/2024	12/2025	01/2024		75%	50%		☐

Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
150	Dinamitzar els eixos comercials de la Vila, amb especial atenció als existents fora del centre.	S'ha obtingut una subvenció del Catàleg de la DIBA d'import 12.000 euros. S'ha sol·licitat pressupost pel desenvolupament del projecte "El comerç connecta" que es desenvoluparà durant els mesos de Setembre a Desembre de 2025, amb especial incidència durant la campanya de Nadal. Així també s'han rebut dues subvencions de la DIBA pel desenvolupament del Mercat de Nadal que tindrà lloc del 17 al 21 de desembre de 2025. Una subvenció de concessió directa per ordre d'entrada de 40.000 euros i una subvenció de 7.509,13 euros per concurrència competitiva.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	43%		☐
151	Potenciar les trobades «Cafè i empresa» com a programa on empreses del municipi poden fer xarxa i crear sinergies.	Les trobades s'han coninuat realitzant durant el primer semestre de 2025, amb dues sessions (març i maig).	09/2023	12/2026	09/2023		55%	55%		☐
152	Reforçar l'oferta d'activitats realitzada en col·laboració amb la DO Alella i el Consorci Enoturístic.	L'acció es desenvolupa d'acord amb les previsions. En 2025 s'ha fet l'Enotast, s'ha tingut presència estand a la Fira Gastronòmica, s'ha realitzat l'Ecuracassoles 2025 i dels cinc 'Tasta el Masnou' programats al llarg de l'any, se n'han fet 2, complint el calendari.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	43%		☐
155	Fer xerrades als instituts del municipi sobre emprenedoria, empresa i cooperativisme, coneixement del món laboral i orientació professional	L'acció es desenvolupa d'acord amb les previsions. Durant el primer semestre del 2025 s'han dut a terme tallers als instituts Maremar i Mediterrània, a l'institut escola Lluís Millet i a l'escola Bergantí. La proposta ha constistit en 8 tallers relacionats amb el món de l'emprenedoria, que han estat triats per les persones participants segons les seves necessitats i s'han adequat als seus calendaris. Dins de les activitats, s'han fet visites a la fàbrica del vidre, activitat que ha tingut una gran acollida. Per al segon semestre del 2025, és prevista la realització de jornades als instituts en clau femenina, emprenedores del municipi que explicaran la seva experiència, així com la sessió inaugural de programa per al nou curs.	09/2023	06/2027	09/2023		48%	48%		☐

3011	Acció cívica i festes
-------------	------------------------------


Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	1	100,00%

Estat d'execució a 30/06/2025		
Previst	Real	Situació
100,00% 	100,00% 	

32711

Equipaments cívics municipals.

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	1	100,00%

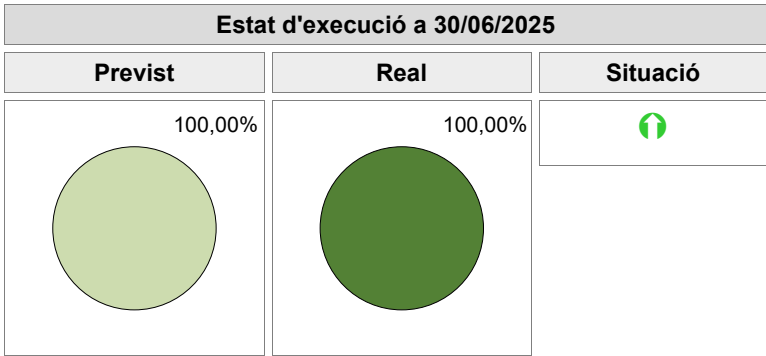



ODS vinculats:



Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
194	Finalitzar el condicionament de l'equipament cívic del carrer del Paraguai i impulsar-ne la dinamització cultural, lúdica i social a través de l'activitat veïnal del Cul d'Ocata.	Les actuacions de millora de l'equipament del carrer Paraguai s'han dut a terme i completat durant l'any 2024. S'ha signat un conveni de cessió d'ús d'espais amb l'Associació veïnal Cul d'Ocata, fins el 2026. L'equipament ha tingut usos continuats amb activitat programada per la entitat i usos puntuals per part de l'Ajuntament i altres entitats.	09/2023	11/2023	09/2023	12/2024	100%	100%		☐

3021	Acció social
-------------	---------------------


Accions	Nombre	%
Planificades:	7	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	5	71,43%
Iniciades:	5	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	1	20,00%

Estat d'execució a 30/06/2025		
Previst	Real	Situació
36,00% 	39,29% 	

23111

Servei bàsic d'atenció social (SBAS).

Accions	Nombre	%
Planificades:	4	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	4	100,00%
Iniciades:	4	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	1	25,00%

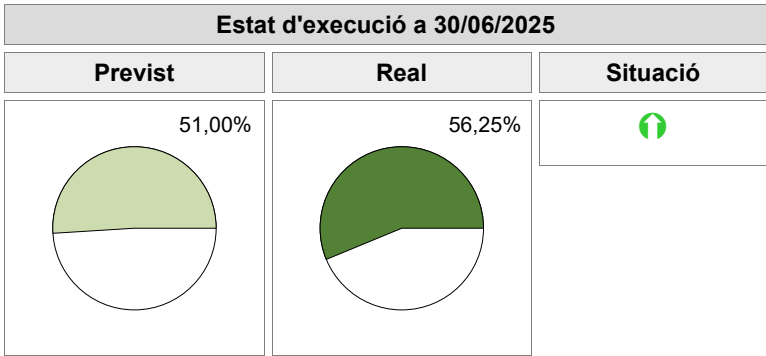

ODS vinculats:




Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
042	Reforçar l'estructura de personal dels serveis socials bàsics tenint en compte les necessitats de la població.	S'ha procedit a la contractació d'una Treballadora social amb l'objectiu d'equilibrar la ràtio de professionals de l'equip bàsic de serveis socials.	01/2025	06/2027	01/2025		20%	25%	↑	☐
043	Redefinir el projecte del Centre de distribució d'aliments (CDA) «La Sitja».	S'ha realitzat el canvi corresponent al FEAD i s'ha incrementat el nombre de targetes moneder, incloent-hi les pròpies, les del programa bàsic i d'altres vinculades al Centre.	01/2025	12/2025	01/2025		49%	50%	↑	☐
045	Mantenir i reforçar, quan sigui necessari, els recursos per pernoctacions d'urgència de persones vulnerables, d'acord amb el protocol d'acollida bàsic.	S'ha tramitat un contracte menor per afrontar la situació d'emergència habitacional, amb l'objectiu de reforçar els recursos destinats a la pernoctació. Pel que fa als pisos de propietat municipal, ja s'han posat a disposició com a recurs habitacional.	06/2024	06/2027	06/2024		35%	50%	↑	☐
047	Millorar el funcionament del Consell de Benestar Social per tal d'afavorir l'intercanvi i la participació de les entitats en les polítiques socials de l'Ajuntament.	L'acció es va completa en le termini previst. Actualment, s'estan executant taules de treball amb objectius clars i concrets, amb la participació activa del tercer sector. Es realitzen, com a mínim, tres o quatre trobades anuals per àmbit, i posteriorment es presenten els resultats al Consell de Benestar Social.	09/2023	12/2023	09/2023	12/2023	100%	100%	↑	☐

23112

Serveis d'atenció a la dependència i promoció de l'autonomia personal

Accions	Nombre	%
Planificades:	3	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	33,33%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

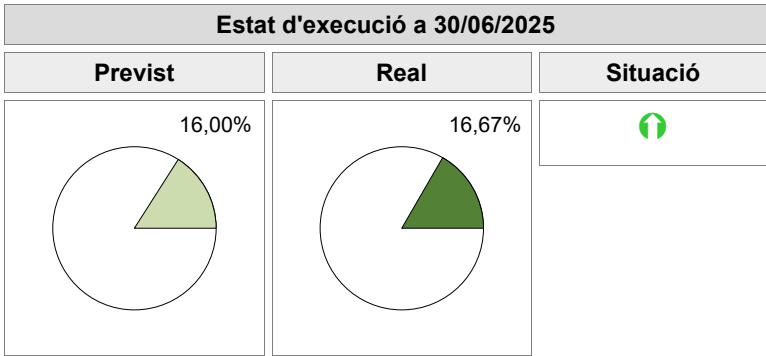



ODS vinculats:



			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
015	Augmentar les hores del servei d'ajuda a domicili (SAD), posant en valor l'activitat de cures i tenint en compte les necessitats de formació i mobilitat de les persones ocupades en aquest sector.	L'acció s'està executant segons les previsions, tenint en compte l'adequació dels imports del Servei d'Atenció Domiciliària i les necessitats pròpies del servei.	09/2023	06/2027	09/2023		48%	50%		☐
027	Estudiar la viabilitat d'un Centre de dia públic i municipal.	Inici previst el gener de 2026.	01/2026	12/2026			0%	0%		☐
044	Impulsar una llar residència vinculada a l'equipament de Can Targa.	L'inici de l'acció és previst per gener de 2026.	01/2026	12/2026			0%	0%		☐

3040	Educació
-------------	-----------------


Accions	Nombre	%
Planificades:	9	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	9	100,00%
Iniciades:	9	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

Estat d'execució a 30/06/2025		
Previst	Real	Situació
43,11% 	43,67% 	

32611

Promoció educativa.

Accions	Nombre	%
Planificades:	9	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	9	100,00%
Iniciades:	9	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

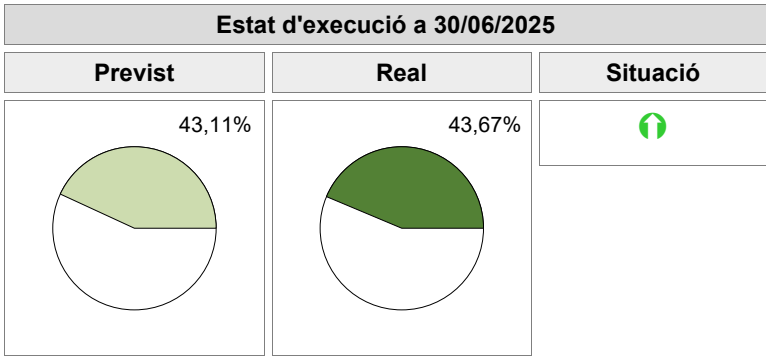

ODS vinculats:

















Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
041	Continuar apostant pel suport econòmic per la participació en sortides i colònies dels centres educatius en els convenis i subvencions anuals.	L'acció es desenvolupa segons allò previst. L'instrument bàsic és la subvenció als centres educatius, ja que es procura que aquests destinin l'aportació municipal a aquesta finalitat..	01/2024	06/2027	01/2024		44%	44%	↑	☐
109	Donar a conèixer l'oferta d'ensenyaments artístics a les entitats i establiments del municipi relacionats amb aquest àmbit i al conjunt del veïnat.	L'acció s'executa amb normalitat en el marc del Projecte Educatiu del Masnou (PEM) i amb instruments com la Guia Educativa.	09/2023	06/2027	09/2023		48%	49%	↑	☐
131	Continuar oferint programes d'aprenentatge, ocupació i inserció laboral per al jovent, com «Primeres oportunitats», Formació Professional Dual i similars.	L'acció es desenvolupa d'acord amb allò previst. Des de la regidoria d'Educació es proposa fusionar aquesta acció amb la número 140, ja que l'objecte és concurrent.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	44%	↑	☐
132	Consolidar el Projecte Educatiu del Municipi (PEM) i fer-ne el seguiment de la seva aplicació amb tota la comunitat educativa.	L'acció s'està executant d'acord amb allò previst. Per l'any 2025 és previst obrir dos nous grups de treball: joventut i pantalles.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	44%	↑	☐
135	Augmentar un grup d'I2 a l'etapa infantil 0-3 de les escoles bressol al curs 2023-2024 i estudiar l'ampliació de l'oferta educativa d'aquesta etapa per als cursos següents.	L'execució de l'acció segueix les previsions. S'ha fet l'increment del grup d'I2 a l'escola bressol Sol Solet i s'està treballant en un projecte d'augmentar dos grups d'I1 a l'escola La Barqueta.	09/2023	06/2027	09/2023		48%	49%	↑	☐

			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
139	Treballar amb l'administració educativa per tal d'adaptar l'oferta de formació professional.	Per una banda, es fa seguiment amb l'administració educativa competent del desenvolupament d el'oferta de FP al municipi. I per altra, des del CFPAM i el Servei Local d'Ocupació s'està estudiant el desenvolupament d'un oferta de formació professionalitzadora complementària.	12/2024	06/2027	12/2024		22%	22%		☐
140	Buscar nova oferta educativa d'ensenyaments postobligatoris presencials en formació professional i programes d'inserció laboral com l'FP Dual.	La regidoria d'Educació proposa la fusió d'aquesta acció amb la número 131, ja que coincideixen en el seu contingut pràctic.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	44%		☐
141	Continuar formant part de la xarxa NOE (Noves oportunitats educatives) de la Diputació de Barcelona	Des del curs 2024-2025 el CFPAM va deixar d'oferir el GES. Des del punt de vista del finançament, actualment es rep pels ensenyaments de llengües (català i castellà) i pels cursos de formació instrumental.	09/2023	06/2027	09/2023		48%	48%		☐
142	Instar la Generalitat de Catalunya a posar en marxa una Escola Oficial d'Idiomes (EOI) al Masnou.	S'han dut a terme gestions prèvies per establir contacte amb l'organ responsable de les EOI i les comunicacions continuaran al setembre. Actualment s'està configurant un mapa per a l'ampliació de les EOI a Catalunya.	01/2025	12/2025	01/2025		49%	49%		☐

3050	Esports
-------------	----------------


Accions	Nombre	%
Planificades:	10	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	10	100,00%
Iniciades:	8	80,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	2	20,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	3	30,00%

Estat d'execució a 30/06/2025		
Previst	Real	Situació
61,80% 	52,00% 	

34111

Programes i activitats esportives.

Accions	Nombre	%
Planificades:	6	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	6	100,00%
Iniciades:	6	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	1	16,67%

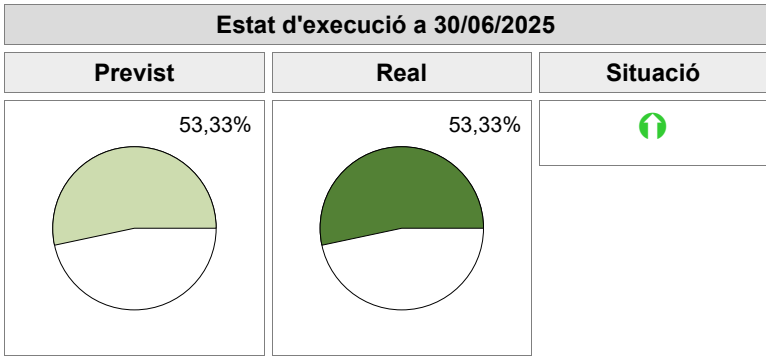

ODS vinculats:














Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
016	Crear nous circuits saludables i punts de pràctica esportiva, tenint especialment en compte l'oci infantil i juvenil, al parc Vallmora i al passeig Marítim.	Al parc Vallmora hi ha 2 projectes en marxa: - Circuit tancat de senderisme saludable o cross (s'està ultimant). - Circuit fix de curses d'orientació. S'ha aprovat la despesa i actualment s'està en vies de fixar quan es fa efectiva, amb intenció que sigui a finals de 2025 o principis de 2026.	01/2024	06/2027	01/2024		44%	44%	↑	☐
038	Aprofundir la col·laboració amb The Ricky Rubio Foundation en les seves iniciatives solidàries.	Segons indica l'àmbit gestor, la col·laboració amb la fundació continua amb normalitat.	01/2024	06/2027	01/2024		44%	44%	↑	☐
049	Crear i impulsar una instància de relació, deliberació i comunicació que impliqui l'Ajuntament i els clubs esportius de la vila.	Al 2025 s'han fet reunions per abordar temes com el protocol de seguretat en equipaments esportius, les ocupacions i usos, i les explicatives sobre subvencions. Es considera que l'acció ha estat completada.	04/2024	12/2024	04/2024	06/2025	100%	100%	↑	☐
051	Continuar el projecte «Esport blau» per potenciar la pràctica d'esports nàutics.	Actualment s'han portat a terme els cursos 23-24 i 24-25. Es troba pendent d'executar, però amb dates ja pactades amb les escoles, el curs 25-26. Restarà pendent de fer el curs 26-27.	01/2024	06/2027	01/2024		44%	44%	↑	☐
052	Elaborar i impulsar un projecte per atreure esdeveniments esportius al municipi.	Les actuacions es desenvolupen segons allò previst.	01/2024	06/2027	01/2024		44%	44%	↑	☐

Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
053	Promoure la pràctica dels escacs, col·laborant en l'organització de tornejos i creant una zona per a la pràctica a l'aire lliure.	El 22 de febrer de 2025 es van inaugurar dues taules d'escacs exteriors al Parc Vallmora, prop de la guingueta. Es va organitzar una jornada oberta a les famílies, liderada pel Club d'Escacs El Masnou. Des del departament d'Esports es van comprar dos jocs de fitxes grans per a jugar al llarg de l'any, que estan en règim de préstec gestionat per la guingueta. Així mateix, es va proporcionar material al Club per a fer tallers durant la jornada. Per tant, es considera que l'execució de l'acció es troba al dia.	01/2024	06/2027	01/2024		44%	44%		☐

34200

Instal·lacions esportives.

Accions	Nombre	%
Planificades:	4	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	4	100,00%
Iniciades:	2	50,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	2	50,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	2	50,00%

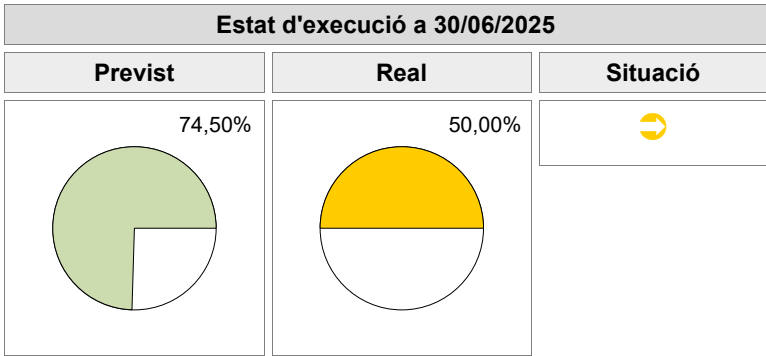



ODS vinculats:



			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
050	Fer un pla de millora dels espais esportius a l'aire lliure.	S'ha previst la despesa al pressupost de despeses, però no consta cap execució material.	01/2025	12/2025			49%	0%		☐
055	Finalitzar el nou gimnàs amb màquines per a la pràctica esportiva individual en el segon pis del Complex esportiu.	L'acció s'ha completat amb el condicionament de l'espai d'acord amb allò programat.	09/2023	02/2024	09/2023	02/2024	100%	100%		☐
056	Crear una nova sala al Complex esportiu, per a la pràctica de l'activitat dirigida de ciclisme de sala.	El dia 2 de juny de 2025 es va inaugurar la sala d' <i>spinning</i> i es van començar a fer sessions tant virtuals com amb monitoratge. Les reserves es fan mitjançant el web d'Esports amb l'aplicatiu informàtic <i>Matchpoint</i> , com en el cas de la resta de reserves del Complex. Es considera que l'acció s'ha completat.	01/2024	12/2024	01/2024	06/2025	100%	100%		☐
057	Estudiar la viabilitat i, en el seu cas, planificar una pista d'atletisme mancomunada entre els municipis del Masnou, Alella i Teià.	No consta que s'hagi dut a terme cap actuació al respecte.	01/2025	12/2025			49%	0%		☐

3062	Gent gran
-------------	------------------


Accions	Nombre	%
Planificades:	2	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	50,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	1	50,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

Estat d'execució a 30/06/2025		
Previst	Real	Situació
10,00% 	22,50% 	

23122

Gent gran.

Accions	Nombre	%
Planificades:	2	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	50,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	1	50,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

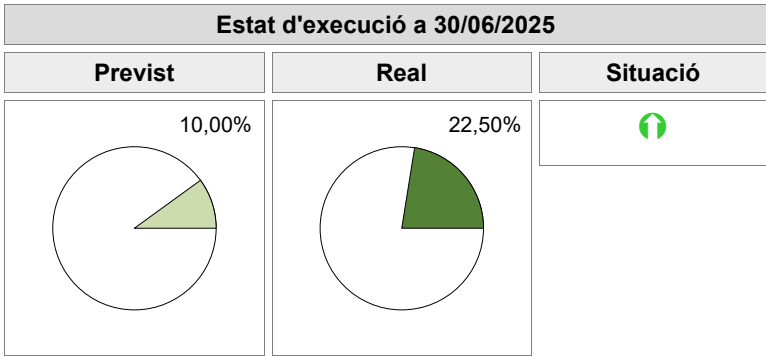

ODS vinculats:











			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
122	Reforçar la programació de l'agenda de la gent gran promovent les activitats intergeneracionals.	A 30 de juny de 2025, la col·laboració del projecte Sostre 360 es manté vigent al casal de Can Malet i s'ha ampliat també al casal de Cal Ros a Ocatà. Es preveu la realització d'una jornada intergeneracional sobre l'edatisme el 16 de novembre (pel matí) que impliqui a col·lectius de ball del poble, gent gran del projecte El Masnou Cuida.	01/2025	06/2027	10/2024		20%	35%		☐
123	Elaborar un pla per l'actualització dels usos i els serveis dels casals de gent gran municipals.	La Diputació ha concedit dit recurs per fer estudi del funcionament dels casals i aquest mes de juliol l'empresa encarregada del servei ja s'ha posat en contacte amb l'òrgan tècnic gestor. En paral·lel, s'està treballant en l'elaboració d'uns estatuts estandaritzats per als 3 casals.	01/2026	12/2026	06/2025		0%	10%		☐

3080	Igualtat
-------------	-----------------


Accions	Nombre	%
Planificades:	4	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	4	100,00%
Iniciades:	3	75,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	1	25,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

Estat d'execució a 30/06/2025		
Previst	Real	Situació
41,75% 	24,25% 	

23128

Igualtat.

Accions	Nombre	%
Planificades:	4	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	4	100,00%
Iniciades:	3	75,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	1	25,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

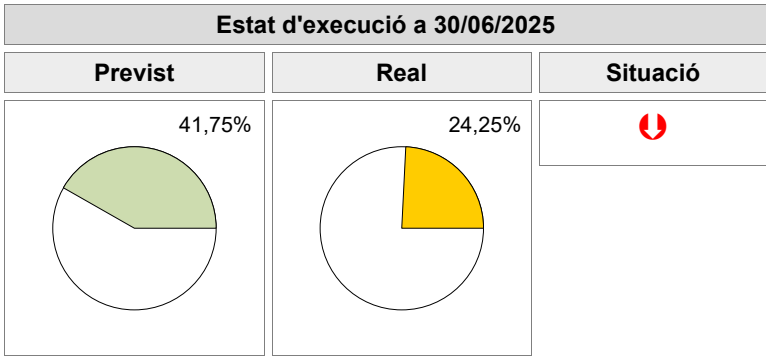

ODS vinculats:












			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
031	Ampliar el programa de coeducació que es va impulsar amb caràcter pilot el curs 2022-2023.	El projecte, iniciat el novembre de 2024, continua desenvolupant-se amb normalitat a dos centres, seguint el calendari previst.	09/2024	06/2027	09/2024		29%	29%		☐
032	Estudiar la viabilitat de destinar un espai per a la Casa de la Igualtat, que així mateix actuï com a centre LGTBIQ+	L'acció no s'ha desenvolupat. Es preveu un retard i que es posarà en marxa a inici de l'any 2026.	01/2025	01/2026			46%	0%		☐
033	Revisar el protocol d'assetjament sexual, violència masclista i LGTBIfòbia.	Es continua treballant amb el Grup de Treball de Prevenció i Sensibilització de la Comissió Tècnica del Circuit d'abordatge a les violències masclistes de vegueria de Barcelona així com Comissió Tècnica del Circuit d'abordatge de les violències masclistes de la vegueria de Barcelona. També s'ha creat el grup de prevenció del protocol d'abordatge violència masclista del Consell Comarcal. L'execució de l'acció s'estendrà durant tot l'any 2026; es preveu l'adhesió al protocol del Consell Comarcal quan aquest s'hagi elaborat i aprovat.	01/2025	12/2025	09/2024		49%	25%		☐
120	Posar noms de dones a carrers i places noves del municipi o a espais urbans (jardins, placetes, parcs...) encara no denominats.	L'acció es desenvolupa d'acord amb el calendari previst.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	43%		☐

3091	Infància i joventut
-------------	----------------------------


Accions	Nombre	%
Planificades:	6	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	5	83,33%
Iniciades:	5	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

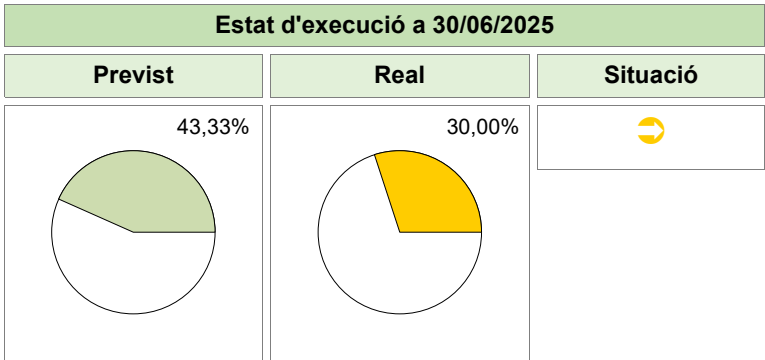

23125

Joventut.

Accions	Nombre	%
Planificades:	3	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	2	66,67%
Iniciades:	2	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

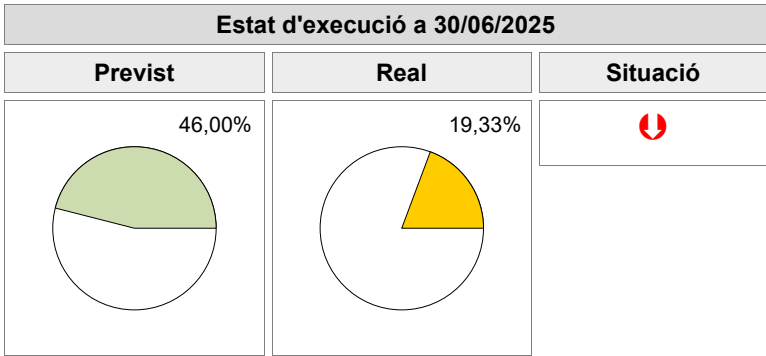

ODS vinculats:




			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
107	Desenvolupar una programació artística jove i implantar ajuts, com el premi a la Creació Jove.	S'ha donat suport al foment de la creació jove en el marc de l'exposició col·lectiva "Visions artístiques. Dos-cents anys de la vila", compresa en els actes de celebració del Bicentenari.	04/2024	06/2027	04/2024		38%	38%		☐
121	Posar a disposició de la Generalitat espais susceptibles de dur a terme camps de treballs mancomunats de descoberta de patrimoni cultural i ecològic de la vila.	Acció pendent d'iniciar el gener de 2026.	01/2026	06/2027			0%	0%		☐
160	Crear un òrgan de participació del jovent, l'Ajuntament Jove, que s'impliqui tant en la gestió com en la dinamització de l'Espai Jove de ca n'Humet.	Des del 16 de juny de 2025 s'està elaborant el Pla Local de Joventut amb el suport de la Diputació de Barcelona. Actualment s'està realitzant la fase de diagnòstic i al setembre es començarà l'elaboració i el procés participatiu amb jovent i agents relacionats amb l'àmbit de la joventut al municipi. Es preveu disposar del Pla a mitjans de 2026.	03/2024	05/2024	03/2024		100%	20%		☐

23126

Infància.

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

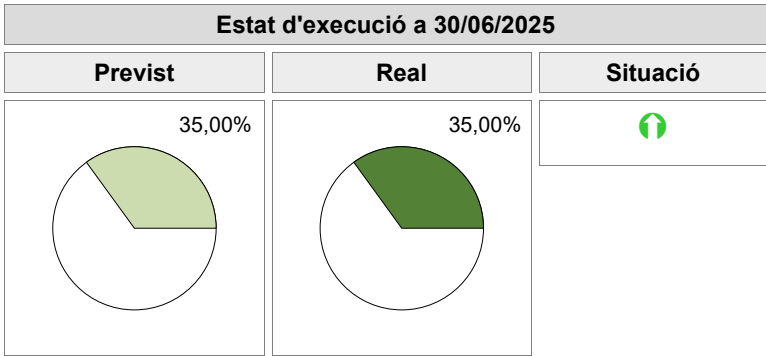

ODS vinculats:




Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
137	Consolidar una agenda de la infància que inclogui totes les activitats, espais i iniciatives adreçades als infants i llurs famílies al llarg de l'any.	L'agenda s'ha publicat el mes de maig de 2025 i s'anirà actualitzant mensualment d'octubre a juliol.	06/2024	06/2027	06/2024		35%	35%	⬆️	☐

32611

Promoció educativa.

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

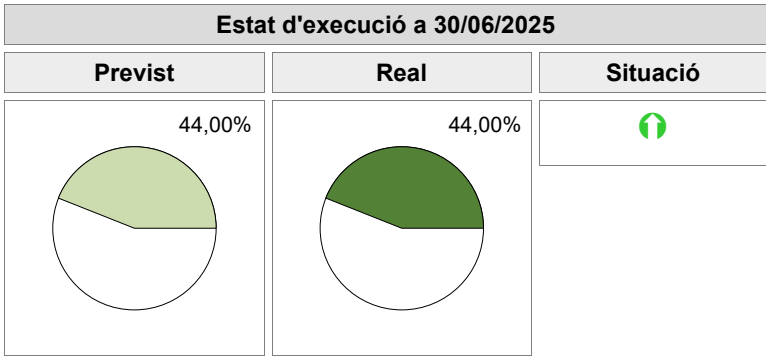

ODS vinculats:
















Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
130	Reforçar l'oferta existent d'aules d'estudi en els períodes d'exàmens.	L'acció es desenvolupa segons allò previst. El primer semestre de 2025 s'ha reforçat l'aula d'estudi a la Biblioteca fora d'horari habitual, oferint obertura entre setmana i cap de setmana en horari nocturn. També s'ha ampliat l'oferta d'aula estudi a Ca n'Humet en horari d'obertura de l'Espai Jove, de dilluns a dissabte de 16.30 a 20.30 h.	01/2024	06/2027	01/2024		44%	44%		☐

32711

Equipaments cívics municipals.

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

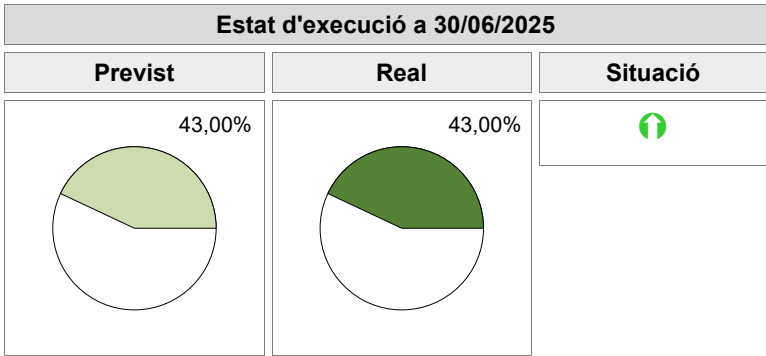



ODS vinculats:



Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
183	Oferir espais a equipaments cívics per la realització d'activitats d'entitats i col·lectius d'infància i famílies.	Durant el primer semestre de 2025 s'ha continuat impulsant la flexibilitat i l'establiment de nous protocols per afavorir la realització d'activitats per part de les entitats i col·lectius d'infància i famílies, utilitzant equipaments com la sala polivalent de La Barqueta, Els Vienesos, Masovers i carrer Paraguai.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	43%	⬆️	☐

3101	Benestar animal, salut pública i consum
-------------	--


Accions	Nombre	%
Planificades:	7	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	7	100,00%
Iniciades:	7	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

Estat d'execució a 30/06/2025		
Previst	Real	Situació
39,86% 	39,86% 	

31112

Sanitat ambiental

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

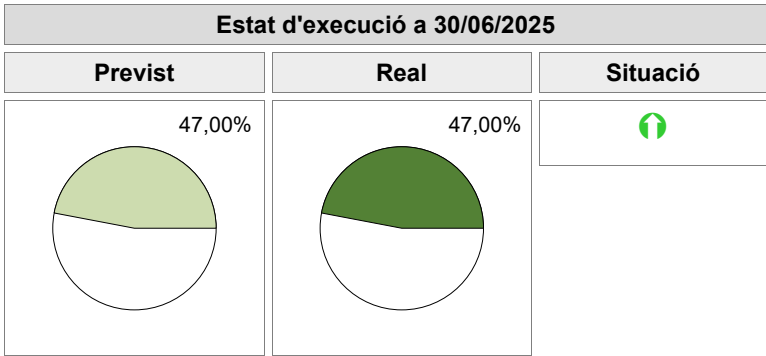

ODS vinculats:




Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
021	Subvencionar la realització de proves per detectar l'existència de gas radó a les llars.	L'acció es desenvolupa segons allò previst. S'han fet els mesuraments del nivell del gas a diferents edificis i s'està a l'espera dels resultats. S'ha demanat una subvenció a la Diputació per fer un tercer estudi el 2025-2026 i s'està treballant sobre com articular la subvenció.	10/2023	06/2027	10/2023		47%	47%	↑	☐

31113

Benestar animal i control d'animals de companyia

Accions	Nombre	%
Planificades:	6	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	6	100,00%
Iniciades:	6	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

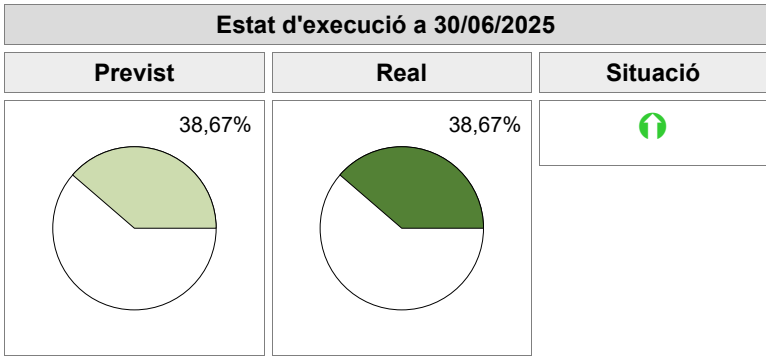



ODS vinculats:



			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
161	Fer una esterilització massiva de les gates i gats de la gatera per controlar la massificació.	Els gats de la gatera s'esterilitzen tots de forma regular.	11/2023	05/2027	11/2023		46%	46%		☐
162	Dignificar els diferents punts d'alimentació per als gats existents a diferents llocs del municipi.	S'han executat actuacions per la dignificació d'un punt d'alimentació.	06/2024	05/2027	06/2024		36%	36%		☐
163	Fer una vegada a l'any la Fira de Benestar Animal on l'Ajuntament donarà veu a les entitats que vetllen i treballen pel benestar animal.	L'acció es desenvolupa d'acord amb les previsions.	10/2024	10/2026	10/2024		36%	36%		☐
164	Crear una platja de gossos digna que doni cobertura durant la temporada de bany a les persones usuàries.	S'ha establert com a platja per gossos definitiva un sector a la platja d'Ocata, entre el carrer del Dr. Botey i l'avinguda de Joan Maragall. Per a la gestió s'ha fet la contractació del muntatge i desmuntatge de les tanques de delimitació i del manteniment del material.	06/2024	06/2027	06/2024		35%	35%		☐
165	Fer una campanya de coneixement de la nova legislació sobre benestar animal i de conscienciació social sobre la tinença d'animals de companyia.	El mes de desembre de 2024 es va fe run tríptic informatiu a l'entorn de la nova llei de benestar animal. Es preveu fer una campanya informativa especifica cada any.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	43%		☐
167	Donar suport a les entitats animalistes i dotar de més recursos les protectores i les gestores de colònies felines.	Es manté la subvenció a les entitats col·laboradores en aquesta acció i s'han realitzat inversions de millora de la gatera.	06/2024	05/2027	06/2024		36%	36%		☐

3110	Salut comunitària
-------------	--------------------------


Accions	Nombre	%
Planificades:	7	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	7	100,00%
Iniciades:	5	71,43%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	2	28,57%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	1	14,29%

Estat d'execució a 30/06/2025		
Previst	Real	Situació
49,43% 	39,57% 	

31121

Promoció de la salut comunitària.

Accions	Nombre	%
Planificades:	7	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	7	100,00%
Iniciades:	5	71,43%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	2	28,57%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	1	14,29%

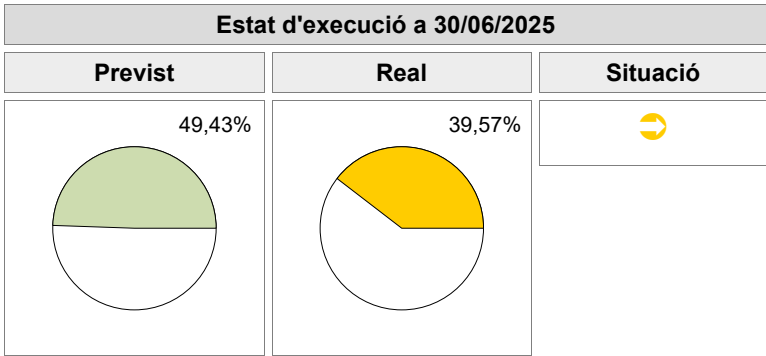

ODS vinculats:





			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
014	Elaborar un protocol que reculli les actuacions col·laboratives que es desenvolupen entre les escoles bressol municipals i el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP).	Es preveu realitzar un encàrrec el mes de setembre de 2025. Per tant, s'endarrerirà el calendari de l'acció de setembre de 2025 a l'agost de 2026.	01/2025	12/2025			49%	0%		☐
017	Impulsar programes de prescripció social en col·laboració amb la Taula de Salut Mental, la Taula de Salut Comunitària i els centres de salut del municipi.	L'acció es desenvolupa amb normalitat durant el primer semestre de l'any 2025.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	43%		☐
018	Continuar potenciant el projecte 'El Masnou cuida' per detectar casos de persones grans que pateixen soledat no volguda i fer-ne el seguiment.	L'acció es desenvolupa amb normalitat durant el primer semestre de 2025. Les activitats previstes es fan de forma continuada i se'n fa seguiment tècnic, seguint el calendari previst.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	43%		☐
025	Participar en les iniciatives que s'impulsen des de les associacions de familiars d'alumnes i els centres escolars per abordar la problemàtica de l'assetjament escolar als centres educatius.	L'acció s'ha desenvolupat amb normalitat durant el primer semestre del 2025.	09/2024	06/2025	09/2024	06/2025	100%	100%		☐
026	Continuar realitzant activitats en centres d'educació primària i secundària per tal de afrontar l'ansietat davant situacions difícils, en col·laboració amb el Centre de Salut Mental del Masnou.	L'acció es desenvolupa amb normalitat durant el segon semestre del 2025.	09/2023	06/2027	09/2023		48%	48%		☐

			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
028	Fer difusió de la xarxa de refugis climàtics a equipaments municipals per fer front a les onades de calor i de fred, i altres efectes del canvi climàtic.	L'acció es desenvolupa amb normalitat durant l'estiu del 2025. S'ha incorporat a la xarxa un nou equipament civi al Cul d'Ocata. Així mateix, s'han actualitzat els horaris d'obertura i s'ha fet difusió per xarxes, al web municipal i a la xarxa de refugis climàtics del Departament d'interior de la Generalitat.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	43%		☐
083	Analitzar la cartera d'actuacions de salut comunitària per determinar la viabilitat econòmica d'oferir nous serveis o incrementar l'abast dels ja existents.	L'acció es durà a terme l'any 2026.	01/2025	06/2027			20%	0%		☐

3121	Solidaritat i cooperació
-------------	---------------------------------


Accions	Nombre	%
Planificades:	4	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	4	100,00%
Iniciades:	3	75,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	1	25,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	1	25,00%

Estat d'execució a 30/06/2025		
Previst	Real	Situació
64,00% 	40,75% 	

23123

Acollida i integració a persones estrangeres immigrades.

Accions	Nombre	%
Planificades:	3	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	3	100,00%
Iniciades:	2	66,67%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	1	33,33%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	1	33,33%

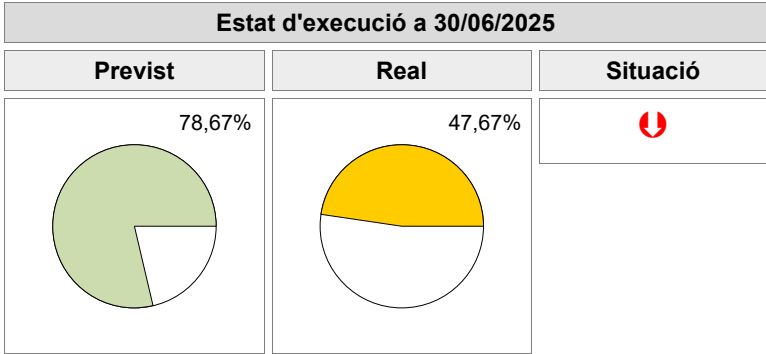

ODS vinculats:




			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
034	Crear una bústia per a la no discriminació i les garanties de dret.	No s'ha desenvolupat. El calendari s'endarrerireix i es preveu l'inici al setembre de 2025.	02/2025	06/2025			100%	0%		☐
035	Celebrar i commemorar de les dates assenyalades i importants per la causa antiracista i de la diversitat cultural.	S'han anat executant les activitats programades per commemorar dates fins al mes de juny. S'han fet activitats per al Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust amb els instituts del municipi i s'ha celebrat la Festa de la Diversitat, el 17 de maig, per commemorar la diversitat cultural.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	43%		☐
037	Crear la Taula de diàleg de Solidaritat i de les persones migrades.	S'ha portat a terme la primera convocatòria de la Taula de diàleg de Solidaritat i de les persones migrades a data 29 d'abril.	06/2024	07/2025	06/2024	06/2025	93%	100%		☐

23124

Solidaritat i cooperació.

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

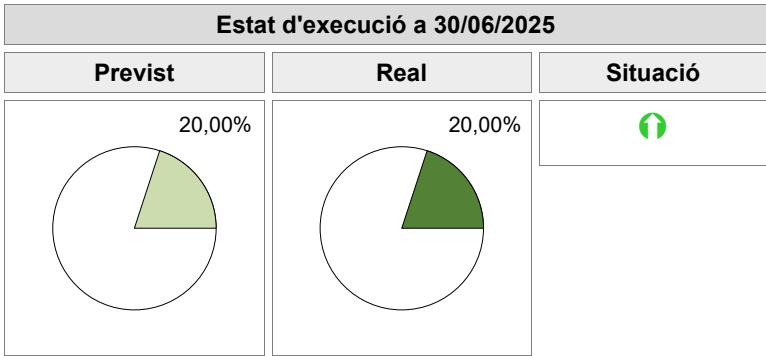



ODS vinculats:



Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
036	Augmentar anualment el pressupost municipal destinat a projectes de cooperació al desenvolupament sostenible i la solidaritat global.	El pressupost municipal destinat a projectes de cooperació internacional ha passat de 22.870,00 € en 2024 a 33.000,00 € en 2025. Es planteja continuar incrementant-lo progressivament per apropar-se al 0,7%.	01/2025	06/2027	01/2025		20%	20%		☐

3130	Accessibilitat i diversitat funcional
-------------	--


Accions	Nombre	%
Planificades:	3	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	3	100,00%
Iniciades:	3	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

Estat d'execució a 30/06/2025		
Previst	Real	Situació
38,67% 	38,67% 	

23127

Persones amb diversitat funcional.

Accions	Nombre	%
Planificades:	3	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	3	100,00%
Iniciades:	3	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

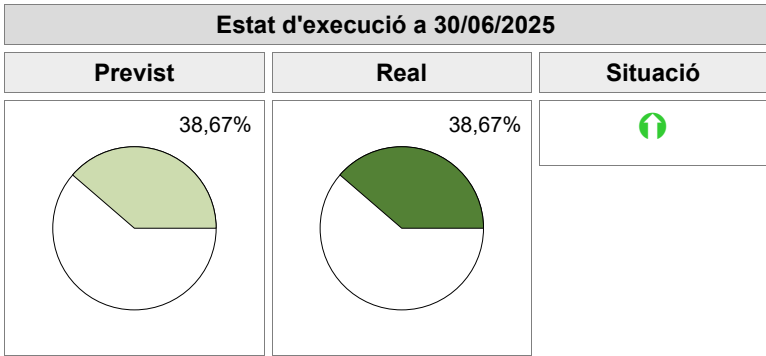

ODS vinculats:





			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
174	Desenvolupar un programa específic d'atenció i suport a les persones amb diversitat funcional que tingui en compte aspectes com l'accessibilitat a l'espai públic.	L'acció es desenvolupa segons el calendari previst. A l'octubre de 2025 es farà la revisió de la guia de recursos en l'àmbit de la discapacitat i s'impulsarà l'aprovació de les "Conclusions i proposta a Ple del grup de treball per l'accessibilitat visual i sensorial".	01/2025	06/2027	01/2025		20%	20%		☐
175	Incorporar pictogrames en tots els espais de comunicació municipal.	L'acció es desenvolupa d'acord amb allò temporitzat i segons el calendari previst.	09/2023	06/2027	09/2023		48%	48%		☐
203	Dotar-se dels recursos necessaris per oferir atenció en llengua de signes des dels diferents àmbits d'atenció a la ciutadania.	Durant l'any 2025 es continua treballant sobre la línia b) "garantir la presència d'intèrprets de signes en les activitats que organitza l'Ajuntament".	09/2023	06/2027	09/2023		48%	48%		☐

4011

Transició ecològica i desenvolupament sostenible


Accions	Nombre	%
Planificades:	21	
Cancel·lades:	1	4,76%
Programades i no cancel·lades	16	76,19%
Iniciades:	11	68,75%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	5	31,25%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	2	12,50%

Estat d'execució a 30/06/2025		
Previst	Real	Situació
36,57% 	27,52% 	

16100

Abastament domiciliari d'aigua potable.

Accions	Nombre	%
Planificades:	2	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	50,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

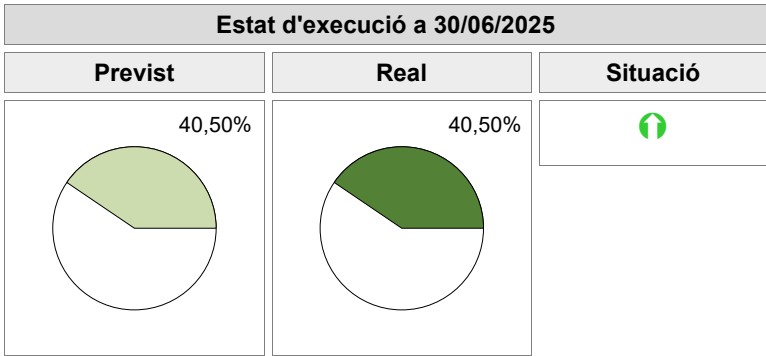

ODS vinculats:










Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
022	Fer un pla per la progressiva substitució de les canonades de fibrociment a la xarxa de distribució d'aigua potable municipal.	Tot i que l'elaboració del Pla és prevista per l'any 2026, quan la gestió del servei ja es farà de la societat municipal SUMEM, s'ha anat invertint en la substitució de canonades en les obres fetes, per exemple durant 2025, als carrers d'Amadeu I, Fra Juníper Serra, Pere Grau i Capitans Comellas, al dipòsit d'aigua del costat del cementiri, i al passeig de Roman Fabra. La Diputació ha concedit una subvenció de 427.500 euros i l'ACA una altra per import de 63.457,46 euros. D'altra banda AGBAR té l'obligació de realitzar canvis de canonades en tres carrers del municipi abans del 31 octubre 2025.	06/2026	06/2027			0%	0%		☐
077	Desenvolupar la gestió directa pública de l'aigua per tal que inclogui els valors de sostenibilitat.	El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 20 de juny de 2024 va aprovar definitivament l'expedient d'establiment i el canvi de forma de gestió del servei públic d'abastament d'aigua potable al municipi del Masnou. Posteriorment, en sessió del 21 de novembre de 2024, el mateix Ple va aprovar les condicions de l'encàrrec de gestió del servei a la societat mercantil municipal SUMEM, SL. El pla de transició de la concessió a la gestió directa s'ha desenvolupat d'acord amb llò previst durant el primer semestre de 2025 i es manté l'objectiu que el novembre d'aquest any SUMEM comenci a prestar el servei.	09/2023	11/2025	09/2023		81%	81%	↑	☐

16210

Recollida de residus.

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	1	100,00%

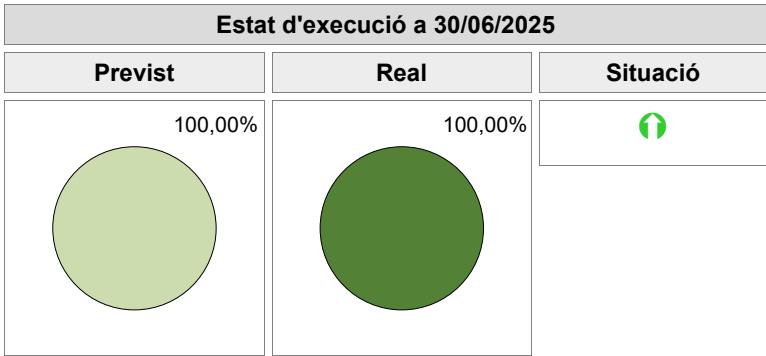

ODS vinculats:




Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
064	Dissenyar, licitar i adjudicar un nou contracte de neteja viària i recollida de residus.	L'acció es va completar l'any 2024.	01/2024	12/2024	01/2024	12/2024	100%	100%		☐

17000

Medi ambient.

Accions	Nombre	%
Planificades:	7	
Cancel·lades:	1	14,29%
Programades i no cancel·lades	5	71,43%
Iniciades:	3	60,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	2	40,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

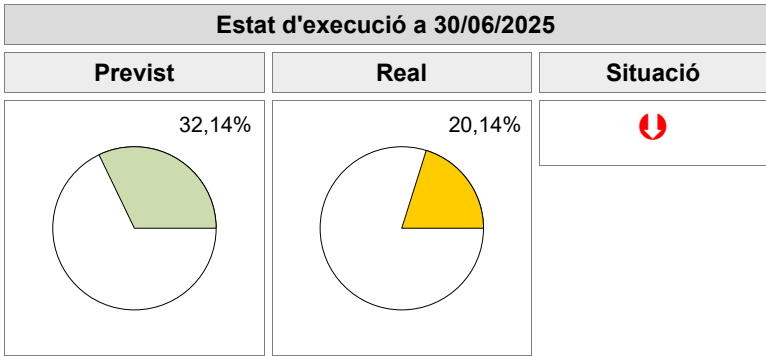

ODS vinculats:




Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
029	Adaptar espais verds que puguin complir la funció de refugis climàtics als diferents barris del Masnou.	L'acció es desenvolupa d'acord amb les previsions. La Diputació de Barcelona, dins el Programa sectorial de Transició ecològica 2030, de suport a inversions locals pel clima (Línia 1), ha atorgat a l'Ajuntament una subvenció de 75.000,00 € que es destinarà a contractar la instal·lació d'umbracles, així com a la plantació d'arbrat. La previsió és que aquestes inversions s'executin abans del mes de novembre de 2025.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	43%		☐
063	Potenciar les adhesions de diferents serveis municipals i privats al certificat de sostenibilitat Biosphere.	L'acció es desenvolupa d'acord amb les previsions. Hores d'ara, l'Ajuntament té acreditacions Biosphere per l'Oficina de Turisme, el Centre d'Empreses Casa del Marquès, el Museu Municipal de Nàutica i les platges d'Ocata i El Masnou. A més, 7 establiments privats disposen també de la certificació Biosphere. Amb un nombre de 12, El Masnou és un dels municipis del Maresme amb més acreditacions Biosphere, darrere de Pineda de Mar (16) i al mateix nivell de Santa Susanna (també 12). En els plecs per a la nova concessió de les guinguetes de la platja per al 2026, s'ha inclòs com a millora ser un punt referent Biosphere.	09/2023	06/2027	09/2023		48%	48%		☐
076	Implantar mesures com el drenatge urbà, la captació d'aigües freàtiques, la recuperació d'aigües i dels aqüífers.	L'acció no s'ha iniciat.	03/2025	06/2027			14%	0%		☐
080	Elaborar una guia de les activitats de l'Ajuntament en l'àmbit de la sostenibilitat.	Per acord de la Junta de Govern Local de 24/10/2024, de revisió del PAM, es va cancel·lar l'acció.	09/2024	06/2027			0%	0%		☒

			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
081	Incentivar projectes als centres educatius relacionats amb el medi, la sostenibilitat i l'ecologia i incorporar-los a la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient.	L'inici de l'execució de l'acció és previst per al mes de setembre de 2025. Amb tot, durant 2024 i el primer semestre de 2025 s'han realitzat ja activitats: cada mes d'octubre es fa una setmana en què es treballa el tema de la prevenció i reciclatge de residus a les escoles; el mes de maig es fan accions de neteja de la platja; durant el dia mundial del Medi Ambient (5 de juny) es fan activitats de coneixement del medi litoral, entre d'altres. Així mateix, s'estan treballant projectes amb l'escola Marinada i l'institut Maremar.	09/2025	06/2027			0%	0%		☐
082	Fer accions de divulgació i conscienciació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 entre els infants i el jovent, com per exemple jocs d'escapada i similars.	L'acció no s'ha iniciat. Probablement es realitzarà a partir de gener de 2026.	01/2025	06/2027			20%	0%		☐
084	Establir un àmbit de participació sobre transició ecològica, desenvolupament urbà i mobilitat sostenible.	Des de la regidoria s'han mantingut reunions amb persones i entitats els mesos de gener, març i maig.	01/2024	12/2024	01/2024		100%	50%		☐

17020

Platges.

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

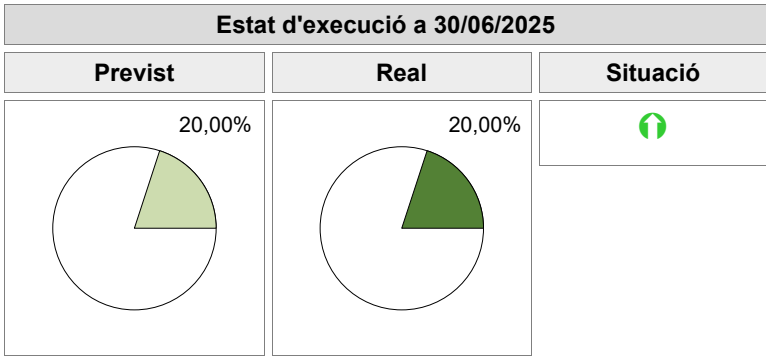

ODS vinculats:




Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
193	Instal·lar a les platges un sistema de megafonia.	El servei de megafonia s'ha instal·lat durant el 2025 com a prova pilot. A finals de temporada es farà una valoració per si es continua instal·lant de cara al futur.	01/2025	06/2027	01/2025		20%	20%	⬆	☐

17100

Parcs, jardins i zones verdes.

Accions	Nombre	%
Planificades:	4	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	3	75,00%
Iniciades:	1	33,33%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	2	66,67%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

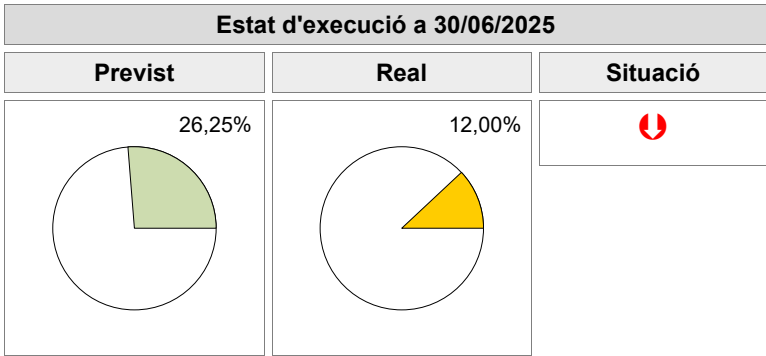

ODS vinculats:














			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
048	Crear horts urbans municipals, gestionats amb la participació d'entitats ciutadanes i afavorint el seu ús per joves amb diversitat funcional o persones aturades.	L'acció no s'ha iniciat, a l'espera de trobar un espai adient.	05/2025	04/2027			8%	0%		☐
071	Elaborar un pla de millora de la biodiversitat al municipi.	L'acció no s'ha iniciat. És previst sol·licitar aquest recurs al catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona del 2026; aquest recurs és imprescindible tirar endavant aquesta iniciativa, conjuntament amb l'àmbit de Paisatge.	01/2025	12/2025			49%	0%		☐
072	Impulsar una campanya de recollida de restes vegetals per tal de convertir-les en adob.	L'inici de l'acció és previst per al mes de gener de 2026.	01/2026	06/2027			0%	0%		☐
073	Dur a terme accions contra el malbaratament alimentari que inclogui l'aprofitament de recursos existents a la vila.	L'acció es desenvolupa d'acord amb el calendari previst. L'Ajuntament s'ha adherit al <i>Plant Based Treaty</i> , en el qual es recullen mesures per evitar el malbaratament alimentari. En els plecs per la nova concessió de les guinguetes de la platja es recull la obligació de proveir els client amb contenidors reciclables per endur-se el menjar que no han consumit.	09/2023	06/2027	09/2023		48%	48%		☐

17210

Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica.

Accions	Nombre	%
Planificades:	3	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	2	66,67%
Iniciades:	2	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	1	50,00%

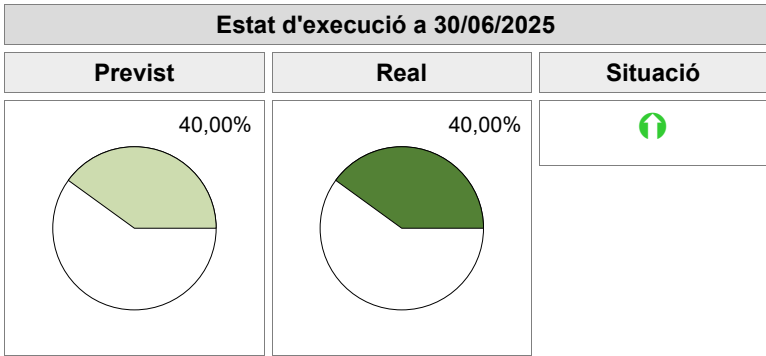

ODS vinculats:




			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
019	Estudiar mesures per reduir les molèsties causades per la contaminació acústica.	S'ha sol·licitat un ajut al catàleg de serveis de la Diputació per a la instal·lació de sensors de cara a la realització d'un estudi de qualitat de l'aire; aquest estudi s'ha realitzat a tres carrers del municipi entre el 25/03/2025 i el 16/06/2025. Aquests sensors també prenen dades de soroll i s'ha sol·licitat a la Diputació que a l'informe final s'incorporin també aquestes dades. Cal tenir en compte que la fiabilitat d'aquests sensors és molt limitada i les dades només serveixen a nivell orientatiu. A finals del 2025 o inicis del 2026 se sol·licitarà un estudi de soroll a la Diputació; cal tenir en compte, però, la limitació d'aquestes dades.	01/2025	06/2027	01/2025		20%	20%		☐
020	Continuar exigint a la Generalitat de Catalunya la construcció de pantalles acústiques que protegeixin el Masnou Alt i Santa Madrona del soroll de l'autopista.	L'acció es va tancar el desembre de 2024. Amb tot, durant el mes d'abril de 2025 la Diputació de Barcelona ha realitzat una nova sonometria de llarga durada a dos punts afectats pel soroll de l'autopista (c. Badalona i pl. Ramon i Cajal). Els resultats mostren que en aquests dos punts se sobrepassen els nivells d'immissió establerts legalment. S'han enviat els resultats als afectats i al Departament de Territori Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya.	02/2024	12/2024	02/2024	12/2024	100%	100%		☐

Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
030	Instal·lar sensors de control de la contaminació acústica en certs espais del municipi.	L'inici d'aquesta acció és previst per al mes de gener de 2026. Amb tot, es va sol·licitar un ajut al catàleg de serveis de la Diputació per a la instal·lació de sensors de cara a la realització d'un estudi de qualitat de l'aire; aquest estudi s'ha realitzat a tres carrers del municipi entre el 25/03/2025 i el 16/06/2025. Aquests sensors també prenen dades de soroll i s'ha sol·licitat a la Diputació que a l'informe final s'incorporin també aquestes dades. Cal tenir en compte que la fiabilitat d'aquests sensors és molt limitada i les dades només serveixen a nivell orientatiu. A finals del 2025 o inicis del 2026 se sol·licitarà un estudi de soroll a la Diputació; cal tenir en compte, però, la limitació d'aquestes dades.	01/2026	05/2027			0%	0%		

42500

Gestió d'energia fotovoltaica.

Accions	Nombre	%
Planificades:	3	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	3	100,00%
Iniciades:	2	66,67%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	1	33,33%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

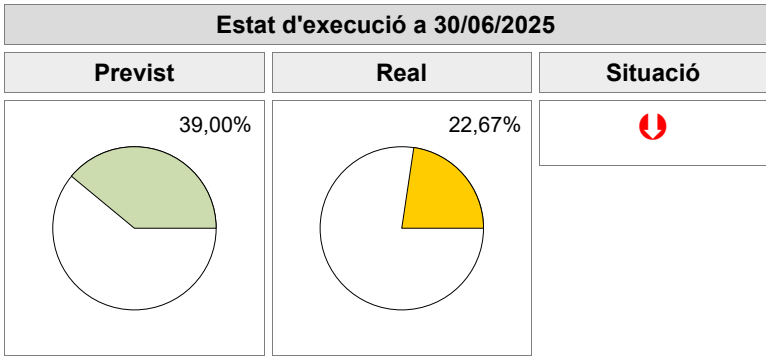



ODS vinculats:



			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
061	Impulsar la creació de comunitats energètiques a partir de la implantació de plaques fotovoltaïques en els equipaments públics.	La subvenció per la instal·lació de plaques fotovoltaïques a la coberta de la piscina i de la remunta del Complex es va concedir i s'ha fet la licitació. Les obres de substitució de la coberta de la piscina començaran a la tardor i seguidament es faran les obres d'instal·lació de les plaques. Ha finalitzat el suport de la Diputació per la implantació de la comunitat energètica. Es té previst demanar una segona part d'aquest recurs perquè donin suport per la posta en marxa de la comunitat.	09/2023	06/2027	09/2023		48%	48%		☐
062	Crear punts de recàrrega elèctrica de vehicles, a partir de l'energia neta generada per plaques fotovoltaïques ubicades a equipaments municipals.	L'inici de l'acció era previst per al mes de gener de 2025. Tot i això, durant 2024 es van iniciar els treballs per a la ubicació de punts de càrrega de vehicles a l'aparcament soterrat de l'Edifici Centre i als jardins de la Nimfa (amb una pèrgola). L'Ajuntament és a punt d'aprovar el conveni amb l'ATM per instal·lar 25 punts de càrrega a l'aparcament de l'Edifici Centre.	01/2025	05/2027	09/2024		20%	20%		☐
066	Revisar i actualitzar la regulació municipal de les instal·lacions d'energia solar.	L'acció no s'ha iniciat; amb tot, es compta amb la referència reguladora de la normativa estatal i autonòmica. Es preveu dur-la a terme més endavant.	01/2025	12/2025			49%	0%		☐

4020	Mobilitat i via pública
-------------	--------------------------------


Accions	Nombre	%
Planificades:	14	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	12	85,71%
Iniciades:	12	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	1	8,33%

Estat d'execució a 30/06/2025		
Previst	Real	Situació
42,86% 	33,86% 	

13310

Estacionament regulat de vehicles

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	1	100,00%

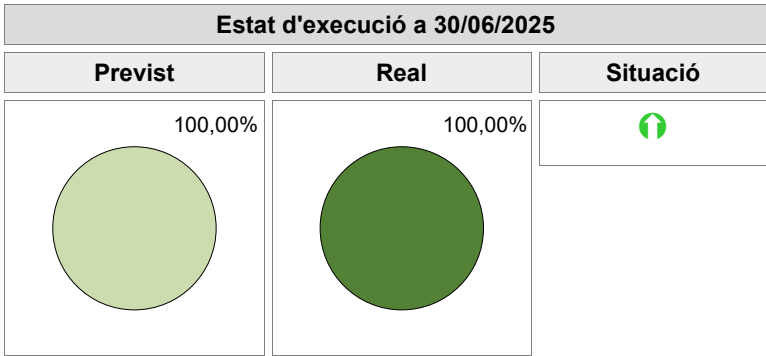

ODS vinculats:




Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
096	Fer una anàlisi exhaustiva dels resultats de la prova pilot de la àrea verda d'estacionament.	L'acció es va completar el novembre de 2023.	09/2023	11/2023	09/2023	11/2023	100%	100%		☐

13400

Mobilitat urbana

Accions	Nombre	%
Planificades:	7	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	5	71,43%
Iniciades:	5	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

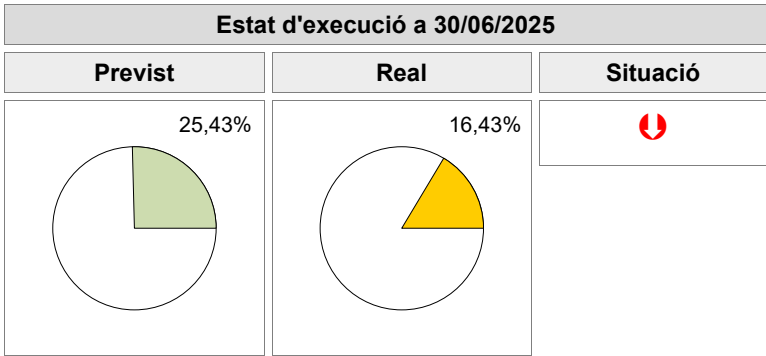

ODS vinculats:














			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
024	Limitar al veïnat l'accés en cotxe entre el carrer de Capità Mirambell i el de Joan Maragall, per pacificar el trànsit al Cul d'Ocata.	L'acció es desenvolupa d'acord amb la previsió. El 12 de desembre de 2024 es va adjudicar el contracte per la redacció del projecte d'urbanització de la plaça de la Vila de Madrid i del carrer del capità Mirambell que ajudarà a assolir l'objectiu de pacificació del trànsit en el sector.	01/2024	04/2027	01/2024		46%	46%		☐
089	Millorar els espais pacificats al voltant de les escoles així com la senyalització dels camins escolars amb una protecció específica, que incentivi els trajectes a peu o en bicicleta.	Durant els mesos de setembre i octubre de 2024 es van realitzar treballs de repintat de tos els passos de vianants existents al voltant de totes les escoles del municipi per reforçar la seguretat dels caminis escolars.	06/2025	09/2025	06/2025		24%	24%		☐
092	Estudiar la creació de carrils bici segregats allà on sigui possible i millorar la senyalització de la xarxa de vies compartides.	L'acció forma part dels treballs de redacció del nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) que redactarà una empresa contractada per la Diputació de Barcelona, com a resultat d'un suport tècnic. L'elaboració del PMUS s'ha iniciat el mes de gener de 2025. Actualment s'ha fet el treball de camp i és en curs d'elaboració la diagnosi. Fins a la fase de propostes no es disposarà de l'anàlisi de la creació dels carrils segregats de bici.	03/2025	03/2026	03/2025		31%	10%		☐
095	Impulsar nous itineraris a peu o en bicicleta que connectin amb Alella i Teià.	La Diputació de Barcelona ha lliurat el projecte relatiu al carril bici entre Alella i El Masnou.	01/2025	12/2026	01/2025		26%	5%		☐
100	Actualitzar i reprendre les subvencions per a la compra de bicicletes elèctriques.	L'inici de l'acció és previst per setembre de 2025.	09/2025	06/2027			0%	0%		☐

			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
105	Estudiar mecanismes per a disposar d'espai d'aparcament al port del Masnou.	L'inici de l'acció és previst per gener de 2026. Amb tot, durant 2025 es tramitarà un conveni amb l'empresa concessionària del Port per tal de facilitar l'ús de l'aparcament pels veïns i veïnes del Masnou.	01/2026	06/2027			0%	0%		☐
136	Pacificar l'entorn de l'escola Lluís Millet.	En data 16 de gener de 2023 es va rebre el projecte bàsic d'actuació en l'entorn de l'escola Lluís Millet, que contempla un pressupost de 598.416,10 €, IVA inclòs. Resta pendent l'execució de les actuacions.	09/2023	03/2027	09/2023		51%	30%		☐

15310

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

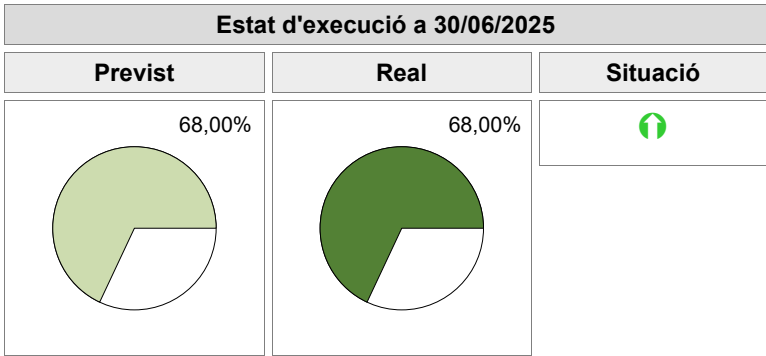

ODS vinculats:




Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
104	Treballar amb la Generalitat per fer realitat els dos nous accessos a la C-32.	Durant 2024 s'ha fet un seguiment exhaustiu dels estudis en relació al projecte de la Generalitat de millora de la connectivitat i nous enllaços de la C-32. Actualment, els projectes es troben en tramitació.	06/2024	12/2025	06/2024		68%	68%		☐

15320

Manteniment i conservació de les vies públiques

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

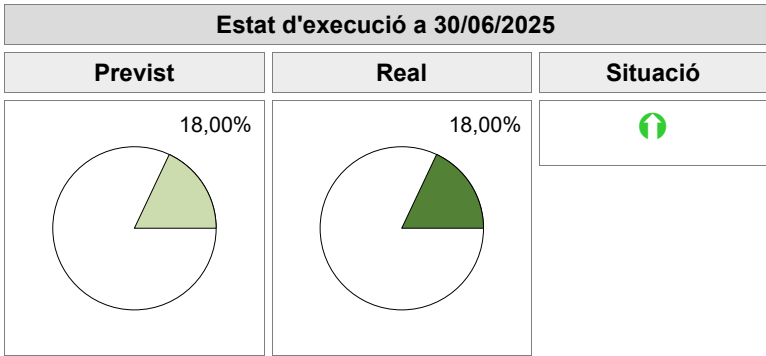

ODS vinculats:












Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
180	Continuar les millores en la urbanització del carrer Navarra.	Durant el primer semestre de 2025 s'ha executat la renovació de l'asfalt del carrer Navarra entre l'avinguda de Joan XXIII i el passeig de Roman Fabra i entre els carrers de Roger de Flor i Pintor Domènech Farré.	05/2025	03/2026	05/2025		18%	18%	↑	☐

44110

Servei d'autobús urbà.

Accions	Nombre	%
Planificades:	2	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	2	100,00%
Iniciades:	2	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

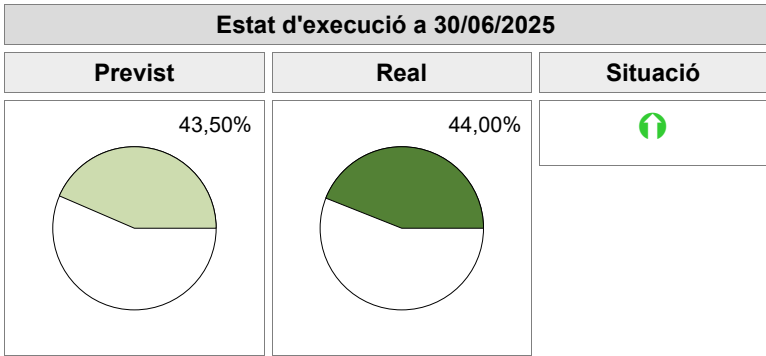

ODS vinculats:






Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
088	Realitzar inversions tecnològiques en el transport públic per fer-lo més eficient en el recorregut.	L'acció es desenvolupa d'acord amb les previsions. A finals de 2024 es va adjudicar el contracte de les obres de millora del servei de la línia C-19, que han suposat una modificació de la freqüència de pas dels vehicles. El març de 2025 es van realitzar comptatges de les persones usuàries de la línia, la qual cosa permetrà analitzar quines inversions cal realitzar per millorar el servei. El 14/07/2025 la línia urbana C19 va restablir el seu itinerari, amb les millores següents: • Trasl·lat de la parada (4) de l'av. de Joan XXIII amb el c. de Francesc Macià, a la confluència amb el c. d'Itàlia. • Recuperació de les parades (5a) c. de Roger de Flor amb el d'Itàlia (plaça Nova de les Dones del Tèxtil) i (5b) c. de Pintor Domènech Farré amb el de Flos i Calcat. • Anul·lació de dues parades: av. de Joan XXIII amb c. de Francesc Macià i c. de Roger de Flor amb c. de Navarra.	09/2024	12/2025	09/2024		62%	62%	↑	☐

Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
103	Augmentar la freqüència de pas de l'autobús municipal en les hores puntes.	A finals de 2024 es va adjudicar el contracte de les obres de millora del servei de la línia C-19, que han suposat una modificació de la freqüència de pas dels vehicles. El març de 2025 es van realitzar comptatges de les persones usuàries de la línia, la qual cosa permetrà analitzar quines inversions cal realitzar per millorar el servei. El 14/07/2025 la línia urbana C19 va restablir el seu itinerari, amb les millores següents: • Trasl·lat de la parada (4) de l'av. de Joan XXIII amb el c. de Francesc Macià, a la confluència amb el c. d'Itàlia. • Recuperació de les parades (5a) c. de Roger de Flor amb el d'Itàlia (plaça Nova de les Dones del Tèxtil) i (5b) c. de Pintor Domènech Farré amb el de Flos i Calcat. • Anul·lació de dues parades: av. de Joan XXIII amb c. de Francesc Macià i c. de Roger de Flor amb c. de Navarra.	01/2025	12/2026	12/2024		25%	26%		☐

44120

Altre transport de viatgers.

Accions	Nombre	%
Planificades:	2	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	2	100,00%
Iniciades:	2	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

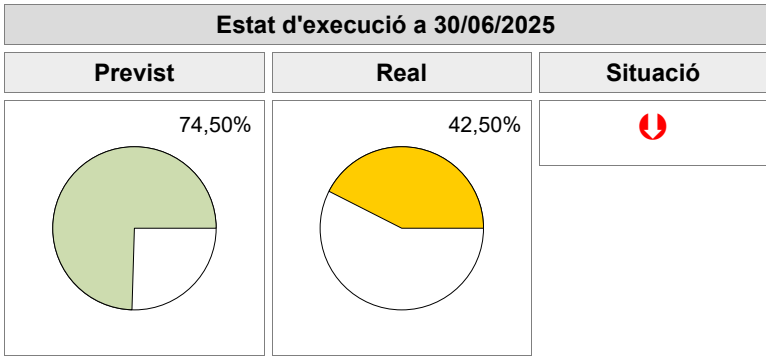



ODS vinculats:



			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
098	Desenvolupar accions per fomentar l'ús del transport públic per part dels infants i el jovent.	El 2025 s'ha fet l'estudi i la coordinació per la migració de títols propis a suport <i>contactless</i> i deixar sense efecte el suport magnètic.	01/2024	12/2024	01/2024		100%	60%		☐
102	Impulsar en el transport de bus nocturn la parada a demanda, i així poder baixar dintre del recorregut el més a prop de casa.	El novembre de 2024 es va fer consulta al cap de la secció de viatgers del S.T. de Barcelona. L'Àrea Metropolitana té un pilot de demanda en serveis nocturn, però amb parades senyalitzades. Fora de les línies interurbanes no s'ha desenvolupat. Es planteja cursar la petició però indicant els punts de parada.	01/2025	12/2025	01/2025		49%	25%		☐

4030	Urbanisme i obres
-------------	--------------------------


Accions	Nombre	%
Planificades:	43	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	30	69,77%
Iniciades:	22	73,33%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	8	26,67%
Avançades a l'inici programat	3	6,98%
Completades a 30/06/2025	2	6,67%

Estat d'execució a 30/06/2025		
Previst	Real	Situació
43,19% 	20,63% 	

13400

Mobilitat urbana

Accions	Nombre	%
Planificades:	5	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	3	60,00%
Iniciades:	3	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	1	20,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

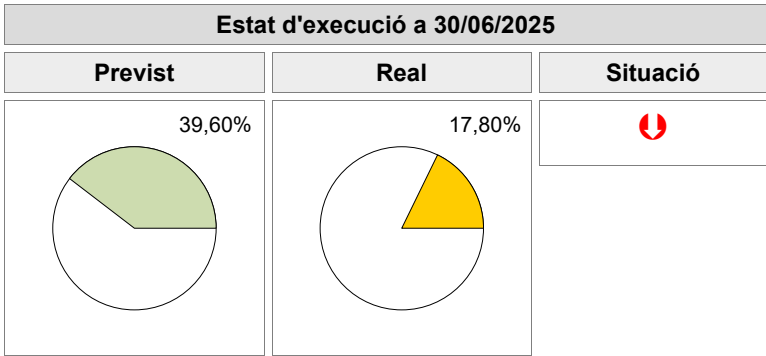

ODS vinculats:














			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
023	Crear un nou espai per a vianants a un tram del carrer de Pere Grau.	Durant 2024, s'ha elaborat el projecte de reurbanització del carrer, entre el carrer dels Capitans Comellas i el del Pintor Miquel Villà. Aquest projecte va ser aprovat inicialment per acord de la junta de govern local de 13 de març de 2025. S'han presentat al·legacions que resten pendents de resoldre. Per acord de la junta de govern local de 03 d'abril de 2025 es va acordar sol·licitar la subvenció d'aquesta obra al PUOSC 2025 - 2029.	01/2025	12/2025	01/2025		49%	49%		☐
087	Desenvolupar el projecte d'urbanització en plataforma única al carrer de Girona.	S'ha elaborat un projecte, que és pendent de revisió i aprovació.	01/2025	12/2025	01/2025		49%	10%		☐
090	Crear aparcaments segurs per a bicicletes prop de les dues estacions de tren i a la plaça Nova de les Dones del Tèxtil.	L'inici de l'acció és previst per maig de 2026.	05/2026	04/2027			0%	0%		☐
091	Desenvolupar el carril bici al costat del municipi a l'N-II de forma segura i accessible en tot el tram del Masnou que connecti amb els municipis veïns de Premià de Mar i Montgat.	L'inici de l'acció és previst per maig de 2026. Amb tot, el projecte de remodelació de la N-II al seu pas pel Masnou ja ha estat elaborat per la Generalitat de Catalunya.	05/2026	04/2027			0%	10%		☐
176	Convertir el darrer tram del carrer de Torrent Umbert en un carrer accessible per vianants.	En data 10 d'octubre de 2024, la Junta de govern local va aprovar definitivament, una vegada resoltes les al·legacions presentades, el projecte de pacificació del Torrent Umbert, entre els carrers de Mossèn Jacint Verdaguer i Rafael de Casanova, per un import de 37.477,94 € (inclòs l'IVA). A la data de seguiment, la licitació encara és en preparació.	03/2024	10/2024	03/2024		100%	20%		☐

15100

Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística

Accions	Nombre	%
Planificades:	11	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	9	81,82%
Iniciades:	7	77,78%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	2	22,22%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

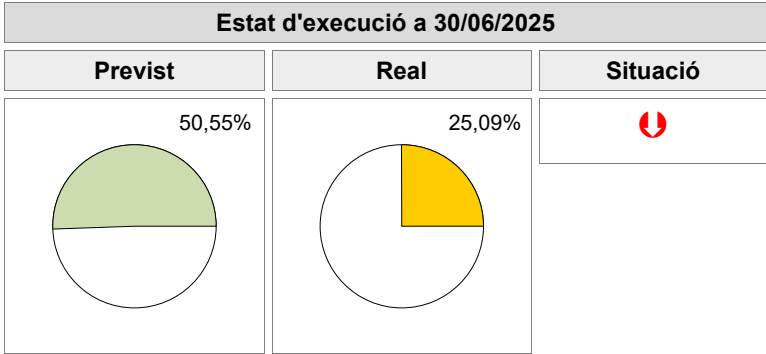

ODS vinculats:




			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
006	Tramitar i desenvolupar el planejament urbanístic de l'Estampadora.	Els serveis tècnics municipals han revisat la proposta elaborada per la propietat i han informat sobre les esmenes que hi cal introduir. Continuen les converses amb la propietat majoritària. I properament s'encarregarà el projecte.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	10%		☐
059	Consolidar equipaments esportius per a ús comunitari al barri de La Colomina.	L'inici de l'acció és previst per gener de 2026.	01/2026	06/2027			0%	0%		☐
097	Desenvolupar un pla urbanístic de la façana marítima.	L'acció es desenvolupa d'acord amb les previsions. S'ha encarregat a l'enginyeria redactora del document ambiental la introducció d'esmenes en la documentació a instàncies de l'OTA. Actualment s'està a l'espera de l'informe de l'OTA.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	40%		☐
106	Millorar la integració del barri de La Colomina amb Santa Madrona, amb el centre de la Vila i amb el municipi de Teià.	Actualment la línia de bus C15 té parada a l'avinguda Kennedy i dona servei al barri de la Colomina.	01/2024	12/2025	01/2024		75%	75%		☐
143	Aconseguir nous espais per equipaments educatius, que es desprenen de la modificació urbanística al sector del Bellresguard.	L'inici de l'acció és previst per gener de 2026. L'acció es troba vinculada al desenvolupament de Can Barnades.	01/2026	06/2027			0%	0%		☐
145	Desenvolupar industrialment el Camí del Mig.	Durant l'any 2024 s'han mantingut contactes amb tots els propietaris per tal d'arribar a un acord de la liquidació de la junta de compensació del PP12. El desenvolupament industrial és supeditat a la resolució de la situació urbanística. No s'han produït canvis respecte de la situació a 31 de desembre de 2024.	01/2024	12/2026	01/2024		50%	15%		☐

			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
146	Crear un cens de solars sense edificar i veure quins poden ser per a sòl terciari i sòl industrial.	L'acció és pendent d'iniciar-se.	01/2025	12/2025			49%	0%		☐
178	Urbanitzar el sector de Can Montals.	Pel que fa a Can Montals sud, es preveu l'inici de les obres el setembre de 2025. Quant Can Montals nord, a 30 de juny de 2025 és pendent de l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació.	09/2023	12/2024	09/2023		100%	40%		☐
185	Reprendre les converses amb l'entitat del Casino a fi d'arribar al màxim d'acords possibles.	Durant l'any 2025 han continuat les converses amb representants de l'entitat per tal d'avançar cap un acord.	09/2023	06/2027	09/2023		48%	48%		☐
188	Fer de la nova plaça de la Vila un espai comunitari, amb comerç local, per finalitzar l'eix que va des del parc de Vallmora fins al mar.	L'inici de l'acció és pendent de l'evolució del procés relatiu al pati del Casino.	01/2025	05/2025			100%	0%		☐
198	Simplificar els tràmits per obtenir llicències urbanístiques.	Durant 2024 s'ha elaborat una nova ordenança, que ha entrat en vigor el gener de 2025. igualment, s'ha treballat la simplificació del procés administratiu, especialment pel que respecta a la millora de les instàncies a presentar per part de les persones interessades en el cas (majoritari) de les comunicacions prèvies. També s'han realitzat millores en els instruments informàtics de tramitació i control de les autoritzacions i s'ha reforçat temporalment l'equip administratiu gestor.	09/2023	06/2027	09/2023		48%	48%		☐

15200

Habitatge

Accions	Nombre	%
Planificades:	6	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	4	66,67%
Iniciades:	4	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

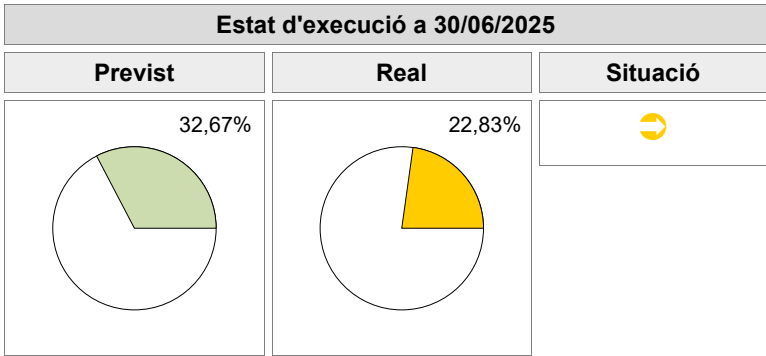

ODS vinculats:














Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
001	Iniciar la nova promoció d'habitatge dotacional en règim de lloguer a la zona de Pau Casals.	El Ple municipal, en sessió celebrada el 10 d'abril de 2024, va aprovar definitivament el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Incasòl. Aquest conveni ha estat ja aprovat per l'Incasòl i es preveu que se signarà el mes de març de 2025. Les properes passes a realitzar són l'adequació de les finques a la regulació del planejament i la redacció i aprovació d'un projecte de reparcel·lació.	11/2023	11/2026	11/2023		54%	10%		☐
002	Iniciar la nova promoció d'habitatge dotacional a la zona del carrer de Montevideo.	L'inici de l'acció és programat per al mes de gener de 2026.	01/2026	11/2026			0%	0%		☐

Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
003	Iniciar la nova promoció d'habitatge de protecció oficial en règim de lloguer a la zona del carrer d'Almeria.	El Ple municipal del mes de desembre de 2024 va aprovar inicialment el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament, l'Incasòl i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al desenvolupament d'aquesta promoció d'habitatge públic. El conveni ha estat aprovat ja per l'Incasòl i es va signar el març de 2025. El 25 d'abril de 2024 es va adjudicar el contracte menor del servei de redacció de l'estudi i encaix volumètric de la modificació puntual del Pla General del carrer Sevilla, a la societat Colectivo CCRS, SCP, per import d'11.555,50 €, IVA inclòs. El projecte de parcel·lació ja s'ha executat des dels Serveis Tècnics municipals, i resten pendents gestions amb el cadastre i el registre de la propietat per a la seva inscripció. El 20 de febrer de 2025 es va adjudicar el contracte menor per a la redacció del Pla Especial, per import de 17.545 €, IVA inclòs. El Pla es va lliurar el 20 de juny de 2025 i es va aprovar inicialment per decret d'alcaldia de data 23 de juny de 2025. Actualment es troba en informació pública.	11/2023	11/2026	11/2023		54%	39%		☐
004	Començar una nova promoció d'habitatge de protecció oficial a Can Barnades.	S'ha aprovat inicialment el projecte de reparcel·lació, que es troba en fase d'informació pública. Durant 2024 s'ha elaborat també el projecte d'urbanització. Ambdós projectes van ser aprovats definitivament per acord de la junta de govern local de 5 de juny de 2025. A dia d'avui, les obres s'estan executant.	06/2024	03/2027	06/2024		38%	38%		☐
005	Començar una nova promoció d'habitatge de protecció oficial a La Colomina Nord.	Les actuacions administratives necessàries han seguit el seu curs durant 2024. Les obres d'urbanització van ser adjudicades per acord de la junta de govern local de 29 de maig de 2025, per import de 260.436,51 €, IVA exclòs.	01/2024	12/2026	01/2024		50%	50%		☐
012	Posar en marxa un pla de promoció de la instal·lació d'ascensors en edificis sense accessibilitat.	L'inici de l'acció és programat per a setembre de 2025.	09/2025	06/2026			0%	0%		☐

15320

Manteniment i conservació de les vies públiques

Accions	Nombre	%
Planificades:	9	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	7	77,78%
Iniciades:	2	28,57%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	5	71,43%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

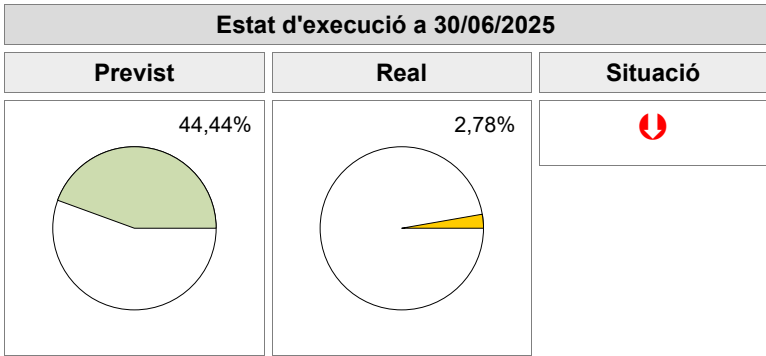

ODS vinculats:




			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
094	Millorar l'accés a peu o en bicicleta entre Voramar I i Voramar II, amb una trama urbana, segura i accessible.	L'inici de l'acció és previst per maig de 2026.	05/2026	04/2027			0%	0%		☐
110	Desenvolupar la plaça de les Lletres davant de la Biblioteca.	S'ha elaborat un avantprojecte.	06/2025	05/2027			4%	10%		☐
177	Millorar la baixada del carrer de Gaudí.	L'acció és pendent d'iniciar-se,	01/2025	05/2025			100%	0%		☐
181	Eliminar progressivament les barreres arquitectòniques al voltant de la plaça de Ramón y Cajal i del carrer de Pau Casals.	L'acció no s'ha iniciat.	03/2025	06/2025			100%	0%		☐
186	Fer realitat la conversió de la carretera N-II en un passeig.	L'inici de l'acció és previst per maig de 2026.	05/2026	04/2027			0%	0%		☐
187	Pacificar el carrer de Tomàs Vives, que deixarà de ser una sortida a l'N-II per esdevenir part de la plaça de la Vila.	L'inici de l'acció és pendent de l'evolució del procés relatiu al pati del Casino.	01/2025	12/2025			49%	0%		☐
190	Millorar la plaça de la Reina Maria Cristina.	L'acció no s'ha iniciat en el termini previst, ja que es troba relacionada amb el replantejament del carrer de Sant Jordi, encara pendent.	01/2025	12/2025			49%	0%		☐
191	Reordenar i introduir millores en l'espai públic del carrer d'Almeria.	L'inici de l'acció és pendent.	01/2025	12/2025			49%	0%		☐
192	Reurbanitzar el carrer de La Segarra.	S'ha fet el projecte. Resta pendent la programació de les obres.	01/2025	12/2025			49%	15%		☐

16400

Cementiri.

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	0	0,00%
Iniciades:	0	0,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	1	100,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

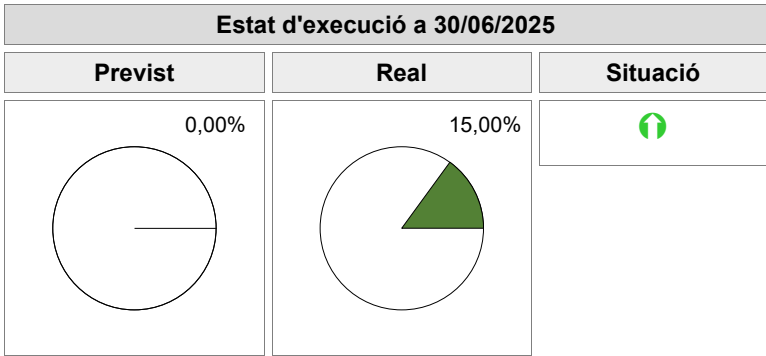

ODS vinculats:




Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
196	Continuar el pla de millores del cementiri.	L'inici de l'acció és previst per setembre de 2025. Tot i això, l'estiu de 2025 es va aprovar definitivament l'establiment del servei de sales de vetlles i de cerimònies, que comporta la realització d'unes inversions valorades en 240.828,46 €. Per altra part, en mesos anteriors s'han fet inversions: adquisició d'un portafèretres (12/2023) i rehabilitació de façanes i cobertes (05-09/2024)	09/2025	06/2026	11/2024		0%	15%		☐

17100

Parcs, jardins i zones verdes.

Accions	Nombre	%
Planificades:	4	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	2	50,00%
Iniciades:	2	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	1	25,00%
Completades a 30/06/2025	1	50,00%

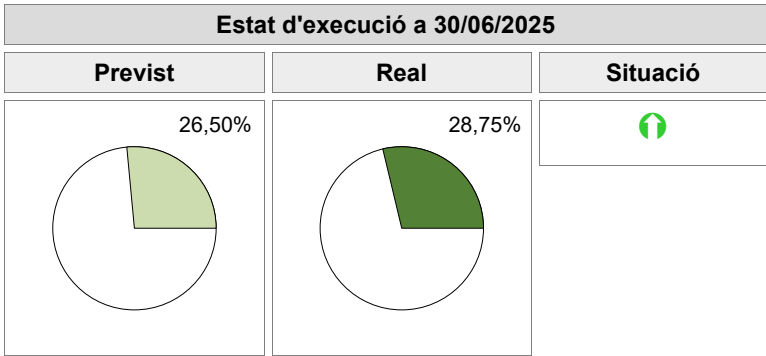

ODS vinculats:














			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
058	Instal·lar un pumptrack al parc de Vallmora, circuit de dimensions reduïdes que es pot recórrer amb bicicleta o monopati.	El 30/12/2024 es va aprovar el contracte per la redacció de l'avantprojecte d'urbanització del parc Vallmora per la implantació del <i>pump track</i> .	06/2025	09/2026	12/2024		6%	5%		☐
074	Ampliar el parc del Mirador.	L'inici de l'acció és previst per a setembre de 2025. L'acció és vinculada a la urbanització de Can Barnades.	09/2025	03/2026			0%	0%		☐
085	Fer el Parc Caramar accessible i atractiu per al veïnat, amb especial atenció a les activitats dinamitzades per la infància, aprofitant la localització del trenet.	Acció completada. El contracte de l'obra va ser adjudicat per acord de la Junta de govern local de 27 de juliol de 2023, per import de 102.668,50 € (IVA inclòs). L'acta de replanteig es va signar l'11 de maig de 2023, amb un termini d'execució de 3 mesos, que es va prorrogar fins finals d'octubre de 2023. L'obra va acabar i es va recepcionar el 27 d'octubre de 2023, amb un sobrecost de 5.292,14 € (IVA inclòs) en concepte d'excés d'amidaments.	09/2023	11/2023	09/2023	11/2023	100%	100%		☐
182	Reordenar l'espai de la zona de rials i l'espai actual del correcan de l'espai verd ubicat al final del carrer de la Goleta Constança.	L'inici de l'acció és previst per gener de 2027., tot i que s'han iniciat actuacions de millora.	01/2027	05/2027			0%	10%		☐

23125

Joventut.

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	0	0,00%
Iniciades:	0	0,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%



ODS vinculats:




			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
054	Fer millores a l'skatepark.	L'inici de l'acció és previst per gener de 2026.	01/2026	12/2026			0%	0%		☐

31113

Benestar animal i control d'animals de companyia

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	0	0,00%
Iniciades:	0	0,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%



ODS vinculats:




Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
166	Crear un circuit d'agilitat per a gossos al Parc Vallmora.	L'inici de l'acció és previst per gener de 2026.	01/2026	12/2026			0%	0%		☐

32300

Funcionament de centres docents d'ensenyament infantil i primari i educació especi

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	1	100,00%

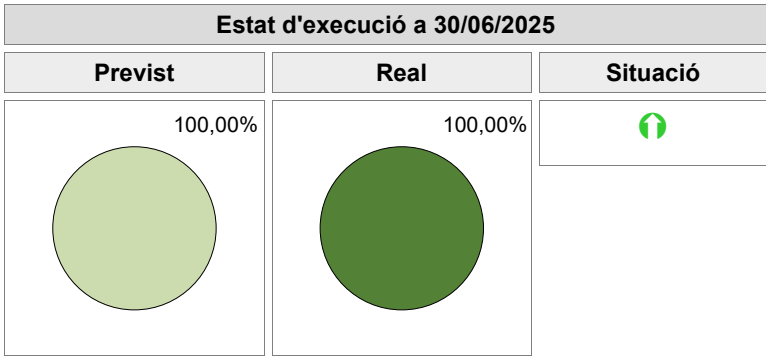

ODS vinculats:




Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
134	Millorar el pati de l'Escola Ocata i abordar la seva accessibilitat.	Les obres de millora del pati de l'Escola Ocata, adjudicades el 12 de juliol de 2024 per un import de 41.745 € (IVA inclòs) i iniciades el 7 d'agost del mateix any, s'han completat segons amb allò previst.	01/2024	12/2024	01/2024	12/2024	100%	100%		☐

32711

Equipaments cívics municipals.

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	0	0,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	1	100,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

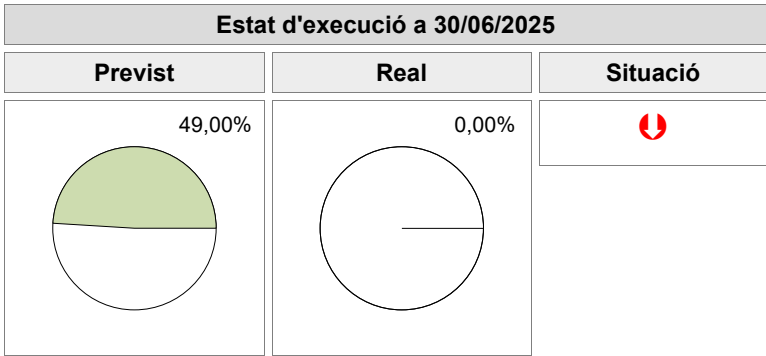


ODS vinculats:



Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
195	Cercar opcions de nous espais per a continuar dotant el barri d'Ocata de més equipaments cívics.	L'inici de l'acció resta pendent.	01/2025	12/2025			49%	0%		☐

33300 Equipaments culturals i museu.

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

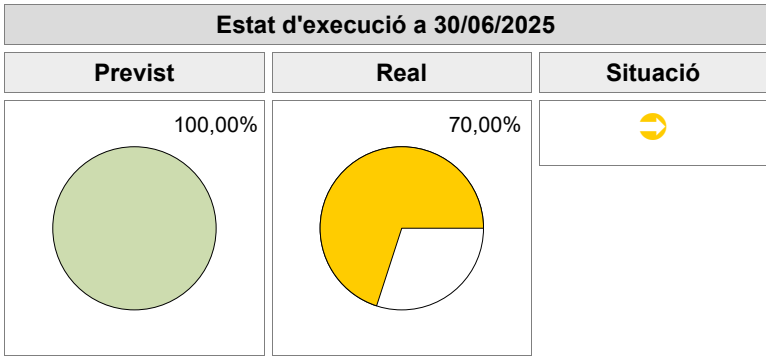

ODS vinculats:




Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
129	Fer un projecte de rehabilitació de l'espai de l'antic cinema del «Casinet», vinculat a les entitats i a la ciutadania, amb uns usos que seran definits a través d'un procés participatiu.	S'ha fet el projecte.	02/2025	05/2025	02/2025		100%	70%		☐

33611

Protecció i gestió del patrimoni històric i artístic.

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

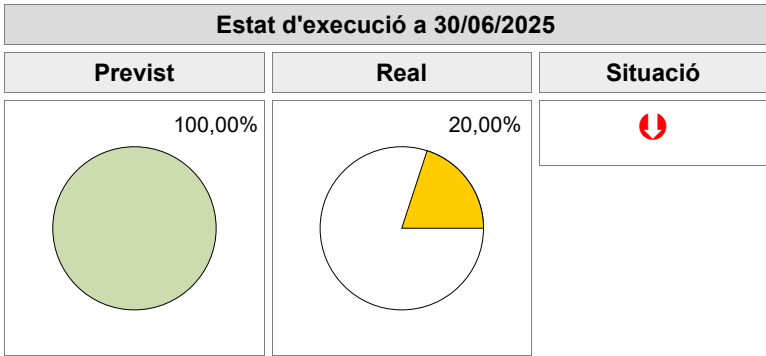

ODS vinculats:




Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
127	Elaborar un Pla Especial de protecció de les Mines d'aigua.	Es troba en curs de redacció la normativa del Pla Especial, a partir de la documentació de l'estudi previ.	01/2024	12/2024	01/2024		100%	20%		☐

43120

Mercats

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

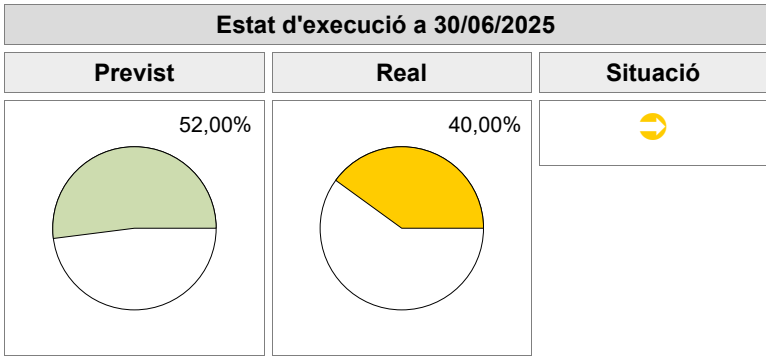



ODS vinculats:



Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
153	Portar a terme el Pla de millora del Mercat Municipal que permeti una nova configuració de l'equipament, amb major visibilitat i integració amb l'entorn.	Durant 2024 s'ha adequat l'aula gastronòmica i s'han fet diferents actuacions puntuals de millora. Durant l'any 2025 s'està treballant el projecte de millora de la infraestructura.	06/2024	06/2026	06/2024		52%	40%		☐

4041	Serveis urbans i manteniment
-------------	-------------------------------------


Accions	Nombre	%
Planificades:	17	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	14	82,35%
Iniciades:	8	57,14%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	6	42,86%
Avançades a l'inici programat	1	5,88%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

Estat d'execució a 30/06/2025		
Previst	Real	Situació
30,53% 	16,41% 	⬇

13400

Mobilitat urbana

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	0	0,00%
Iniciades:	0	0,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%



ODS vinculats:














Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
179	Crear un itinerari segur, quant il·luminació i voreres accessibles, des de les estacions de tren del Masnou i Ocata fins al barri del Masnou Alt.	L'inici de l'acció és previst per al gener de 2026. No obstant, s'han iniciat els treballs per a la redacció del PMUS, que tindrà en compte els objectius d'aquesta acció.	01/2026	06/2027			0%	0%		☐

15320

Manteniment i conservació de les vies públiques

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	0	0,00%
Iniciades:	0	0,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	1	100,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

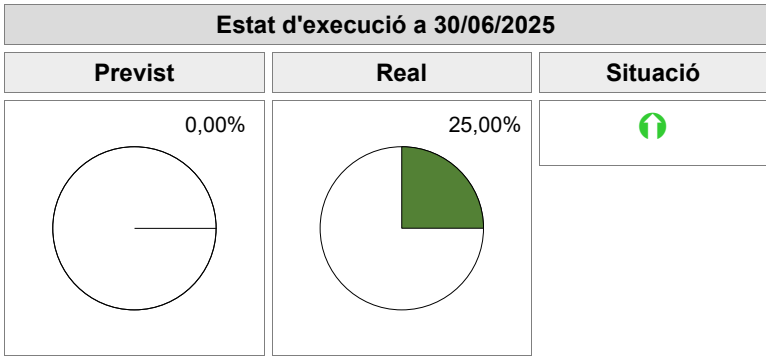

ODS vinculats:












Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
065	Instal·lar mobiliari urbà fet amb els plàstics que es fan de les recollides selectives.	Tot i que l'inici de l'acció és previst per al mes de setembre de 2026, durant el primer semestre de l'any 2025 s'han adquirit ja papereres fetes amb plàstic reciclat.	09/2026	06/2027	01/2025		0%	25%		☐

16500

Enllumenat públic.

Accions	Nombre	%
Planificades:	3	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	2	66,67%
Iniciades:	2	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

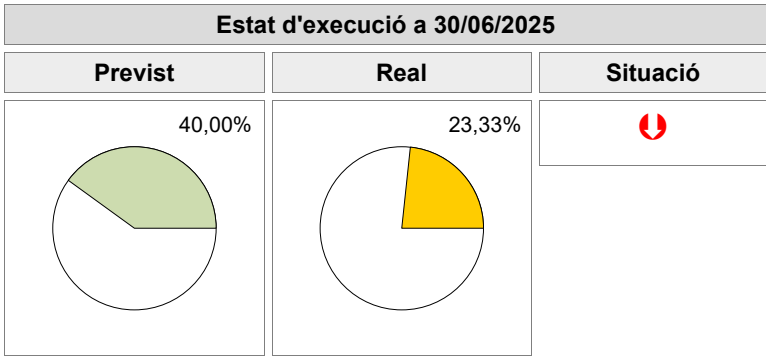

ODS vinculats:




			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
078	Regular el flux lumínic i el funcionament dels fanals, adaptant-lo a les necessitats de cada zona.	L'execució de l'acció és pendent de la concessió de la subvenció de la Diputació. Hores d'ara el recurs ja ha estat concedit i s'està a l'espera dels inicis dels treballs per part de l'empresa adjudicatària.	01/2025	06/2027	10/2024		20%	5%		☐
079	Utilitzar progressivament energia solar per alimentar l'enllumenat públic.	L'inici de l'acció és previst per gener de 2026. Tot i això, l'equip tècnic municipal ja treballa amb l'empresa que ha fet la instal·lació de les plaques fotovoltaiques municipals per tal de posar-les en marxa.	01/2026	05/2027			0%	0%		☐
099	Il·luminar el passeig Marítim fins a Montgat.	Al mes de març de 2025 es va emetre informe favorable del Servei de Contaminació Lumínica de la Generalitat. El mes d'abril es va rebre l'oferta de condicions per a l'ocupació del DPMT, per part del Servei del Litoral de la Generalitat, que s'aprova per l'Ajuntament. El mes de juny es va rebre l'autorització per fer les obres per part del Servei del Litoral de la Generalitat, així com també l'autorització d'ADIF. El mes de juliol es faran els tràmits per contractar l'execució de les obres.	05/2024	06/2025	05/2024		100%	65%		☐

17000

Medi ambient.

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

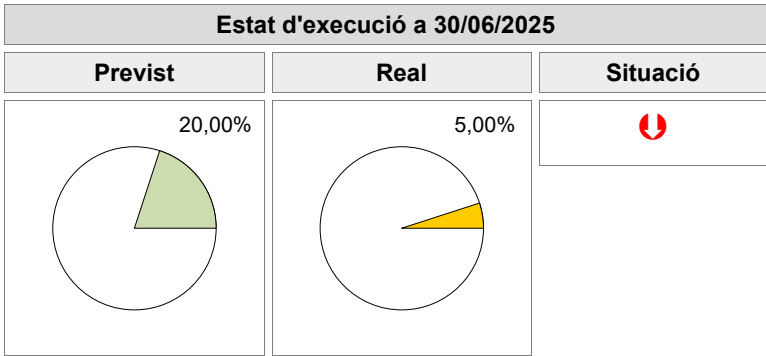

ODS vinculats:




















Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
060	Implantar mesures del Pla d'estalvi energètic en edificis municipals i enllumenat públic.	L'inici de l'acció és previst per gener de 2025. Amb tot, hi ha un retard en l'execució, que es preveu reprendre el setembre de 2025.	01/2025	06/2027	01/2025		20%	5%		☐

17020

Platges.

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	0	0,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	1	100,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

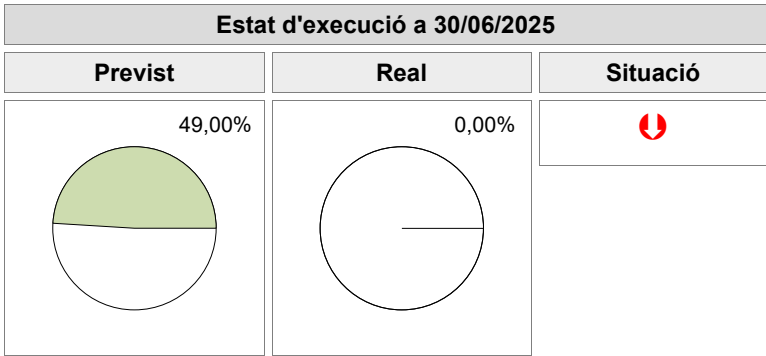

ODS vinculats:




Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
067	Delimitar les zones de protecció i recuperació dels ecosistemes sorrencs i d'espècies naturals a les platges.	L'acció no s'ha iniciat perquè es preveia tenir pressupost per l'exercici 2025, però no ha estat així. A més, cal tenir en compte que són necessaris permisos del Ministeri competent per l'ocupació del domini marítimoterrestre.	01/2025	12/2025			49%	0%		☐

17100

Parcs, jardins i zones verdes.

Accions	Nombre	%
Planificades:	6	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	6	100,00%
Iniciades:	4	66,67%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	2	33,33%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

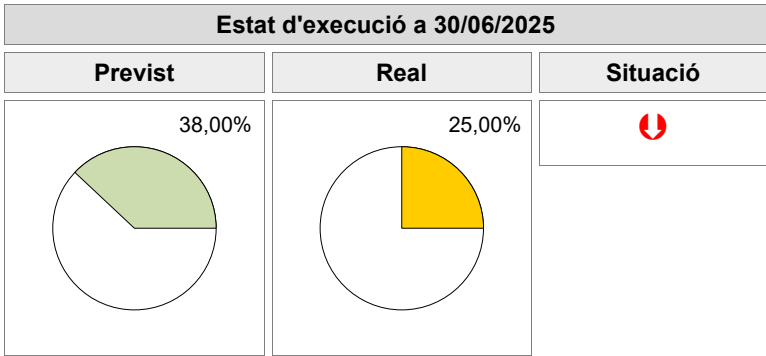

ODS vinculats:














Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
068	Utilitzar espècies pròpies de l'ecosistema mediterrani als espais verds municipals.	Durant el primer semestre de 2025 s'han fet plantacions amb aquest criteri, que es preveu continuar el proper mes de novembre.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	30%		☐
069	Crear façanes verdes als nous equipaments.	L'acció no s'ha iniciat en el termini previst per no disposar del pressupost adient.	01/2025	12/2026			25%	0%		☐
070	Millorar l'arbrat viari, substituint espècies no adequades per les seves dimensions, la seva ubicació o el deteriorament de les voreres.	De forma similar a l'acció 068, l'acció es desenvolupa com un criteri que s'aplica en la gestió de l'arbrat viari. Durant el primer semestre s'ha desenvolupat d'acord amb allò previst.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	50%		☐
075	Dur a terme accions, d'acord amb l'Agència Catalana de l'Aigua, per la restauració de la riera d'Alella.	Es segueix demanant les subvencions per restauració de lleres en trams urbans i enguany es torna a realitzar la restauració d'una nova zona de la riera.	09/2023	06/2027	09/2023		48%	50%		☐
138	Crear una ruta al Parc del Llac i el seu entorn per als infants del municipi on puguin descobrir diferents elements de la zona.	L'acció no s'ha iniciat.	01/2025	12/2025			49%	0%		☐
184	Completar una xarxa de parcs infantils inclusius i accessibles al nostre municipi amb una configuració més atractiva i un manteniment més curós.	L'acció es va executant a mesura que es renoven o s'instal·len nous parcs infantils. L'any 2024 es va construir un nou parc infantil al carrer de la nau i s'hi van incloure elements inclusius. Per a 2025 hi ha previst renovar el Parc del Mil·lenari i dos parcs més amb 70.000€ d'inversió previstos.	01/2025	06/2027	01/2025		20%	20%		☐

23127

Persones amb diversitat funcional.

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	0	0,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	1	100,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

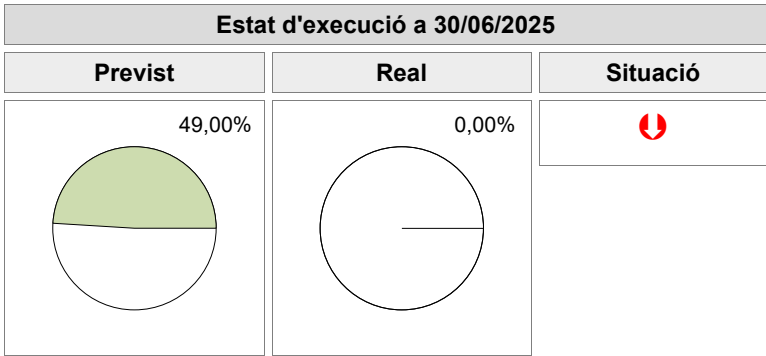

ODS vinculats:




			Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
Núm.	Acció	Comentari	Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
173	Fer un estudi de millora de l'accessibilitat dels principals equipaments i altres espais públics municipals, com parcs i zones verdes.	L'acció és pendent d'iniciar-se.	01/2025	12/2025			49%	0%		☐

32300

Funcionament de centres docents d'ensenyament infantil i primari i educació especi

Accions	Nombre	%
Planificades:	1	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	1	100,00%
Iniciades:	1	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

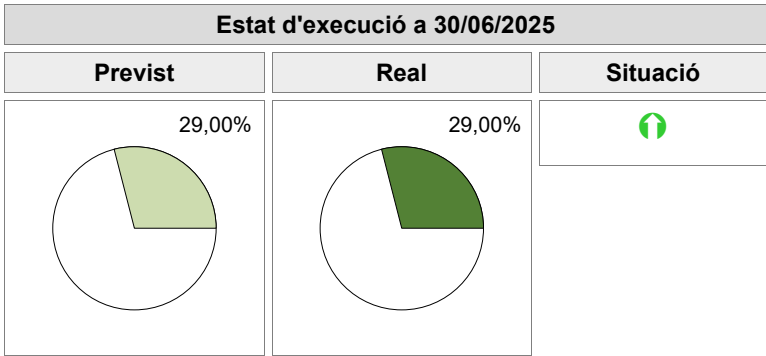

ODS vinculats:




Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
133	Aplicar el programa d'accions de manteniment i millora dels centres educatius públics, amb la corresponent dotació pressupostària.	L'acció es desenvolupa d'acord amb les previsions. Les actuacions previstes a realitzar l'estiu de 2025 són: • Millora del lavabo de l'I3 a l'Escola Ocata, per import de 5.263,50 €. • Insonorització de dues aules a l'Escola Ocata • Adequació de l'antiga aula d'informàtica com a aula polivalent a l'Escola Marinada, per import de 5.263,50 €. • Millora de la impermeabilització del gimnàs de l'Escola Rosa Sensat, per import de 4.489,10 €. • Renovació del paviment de dues aules d'educació infantil a l'Escola Ferrer i Guàrdia, per import de 2.125,97 €. • Arranjament de l'espai exterior de l'EB Sol Solet, pendent contractació. • Climatització de dues aules a l'EB La Barqueta, pendent contractació. A més, també es preveu destinar una partida del capítol 6 del pressupost per a la reforma de la cuina de l'Institut Escola Lluís Millet, per import de 83.308,50 €	09/2024	06/2027	09/2024		29%	29%	↑	☐

92060

Gestió d'edificis municipals.

Accions	Nombre	%
Planificades:	2	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	2	100,00%
Iniciades:	0	0,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	2	100,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	0	0,00%

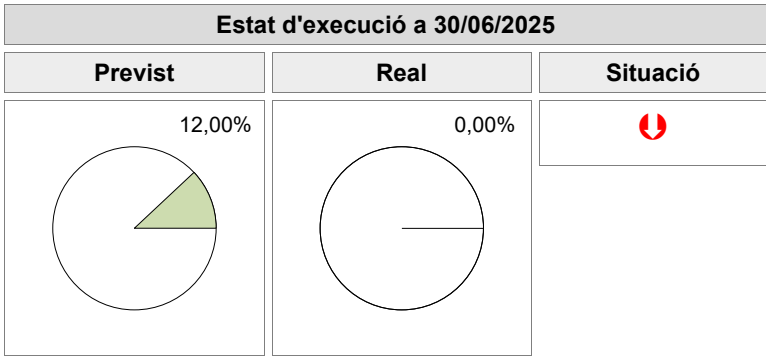



ODS vinculats:



Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
086	Dotar els equipaments municipals amb instal·lacions automatitzades per a la millora de la seguretat, l'eficiència energètica i l'accessibilitat.	L'acció és pendent d'iniciar-se, tot i que s'ha començat a treballar en diverses línies: • Actuacions d'estalvi d'aigua (mitjançant airejadors i aixetes automàtiques, per evitar que les aixetes quedin obertes) i d'energia a les escoles bressol. • Instal·lació d'equips de mesura elèctrica als bars dels camps de futbol d'Ocata i del Masnou per poder fer un seguiment del consum. • Reducció del cabal d'algunes aixetes que no tenen airejadors, per disminuir el consum d'aigua. Pel que fa a la dotació d'instal·lacions automatitzades als equipaments que millorin l'accessibilitat es treballa, per exemple, en la instal·lació de mecanismes d'obertura automàtica de les portes.	01/2025	06/2027			20%	0%		☐
126	Instal·lar focus als edificis més emblemàtics del Masnou per il·luminar en colors segons commemoracions diverses.	L'inici de l'acció resta pendent.	06/2025	06/2027			4%	0%		☐

4050	Habitatge
-------------	------------------


Accions	Nombre	%
Planificades:	7	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	7	100,00%
Iniciades:	7	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	1	14,29%

Estat d'execució a 30/06/2025		
Previst	Real	Situació
44,57% 	48,14% 	

15200

Habitatge

Accions	Nombre	%
Planificades:	7	
Cancel·lades:	0	0,00%
Programades i no cancel·lades	7	100,00%
Iniciades:	7	100,00%
Programades i no iniciades a 30/06/2025	0	0,00%
Avançades a l'inici programat	0	0,00%
Completades a 30/06/2025	1	14,29%

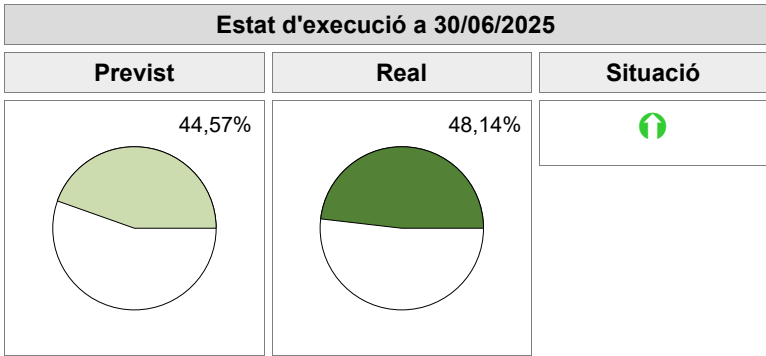

ODS vinculats:













Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
007	Promoure la borsa de lloguer social oferint incentius, ajuts i serveis de suport a la propietat que facin atractiva l'adscripció d'habitatges.	La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de juny de 2025, va aprovar el Pla per a la mobilització dels habitatges buits i el Programa d'inspeccions del municipi del Masnou 2025-2027, amb l'objectiu de detectar i activar els habitatges permanentment desocupats i promoure'n la incorporació al mercat de lloguer, preferentment a través de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. En el marc d'aquest Pla, s'estan valorant diverses mesures incentivadores, entre les quals hi ha la possibilitat d'establir bonificacions fiscals per als propietaris que cedeixin el seu habitatge per a finalitats d'habitatge assequible.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	44%	↑	☐
008	Crear un cens d'habitatges buits	Durant l'any 2024 s'ha fet un treball de detecció de possibles habitatges buits, a partir de diversos indicis. L'aprovació del Pla per a la mobilització dels habitatges buits i del Programa d'inspeccions al municipi del Masnou 2025-2027 per part de la Junta de Govern Local, en sessió de 19 de juny de 2025, permetrà elaborar el cens d'habitatges buits pròpiament dit, ja que la seva posta en marxa permetrà confirmar la situació real dels habitatges detectats. Fins a 30 de juny de 2025, s'han inspeccionat 114 habitatges dels 591 inicialment identificats com a possibles buits.	10/2023	12/2024	10/2023		100%	80%	↻	☐

Núm.	Acció	Comentari	Calendari actual		Execució		Estat d'execució			
			Inici	Final	Inici	Final	Previst	Real	Situació	Canc.
009	Desenvolupar un programa d'inspeccions per assegurar el compliment de la normativa municipal en matèria d'apartaments turístics i de lloguer d'habitacions.	Des de les regidories d'Habitatge i de Medi Ambient (responsable del control d'activitats) s'ha iniciat una campanya informativa adreçada als titulars d'habitatges d'ús turístic amb llicència municipal. En aquesta comunicació s'ha recordat el conjunt d'obligacions legals que estableix l'ordenança municipal reguladora, incloent-hi la possibilitat de realitzar inspeccions i les conseqüències derivades de l'incompliment de la normativa vigent, amb especial èmfasi en el règim sancionador. A més, s'ha facilitat a les persones titulars el cartell de bones pràctiques per a la seva col·locació a l'habitatge, i se'ls ha informat sobre la manera de procedir en cas que no vulguin continuar fent ús de la llicència, tot recomanant-ne la baixa voluntària. D'altra banda, s'ha actualitzat la informació relativa als HUT a la pàgina web municipal, i s'han iniciat actuacions de recerca i comprovació mitjançant l'aplicatiu habilitat per la Generalitat de Catalunya. Pel que fa al control de les embarcacions turístiques, segons les dades obtingudes a través del <i>software</i> d'inspeccions, se n'han identificat 14, de les quals 2 no es trobaven actives, i només 5 han pogut ser verificades i identificades correctament fins al moment. En relació amb els HUT, s'han detectat un total de 142 habitatges publicitats com a allotjaments turístics, dels quals 13 operen presumptament sense disposar de la llicència corresponent. Davant d'aquests indicis d'activitat irregular, es preveu iniciar les accions corresponents, tant en coordinació amb Ports com amb la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.	01/2025	06/2027	06/2024		20%	25%		☐
010	Dotar l'Oficina Local d'Habitatge de més recursos per a donar més servei a la ciutadania en matèria d'habitatge i rehabilitació.	El mes de gener de 2025 es va iniciar la contractació d'un tècnic de rehabilitació i inspeccions d'habitatges al municipi del Masnou, mitjançant un contracte programa, amb una durada prevista d'un any.	05/2024	06/2027	05/2024		38%	38%		☐
011	Desenvolupar accions per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges.	Aquesta acció es desenvolupa bàsicament a través de les subvencions per a la rehabilitació d'habitatges. Durant l'any 2025 és previst valorar la pertinència de modificar les bases específiques i la convocatòria d'aquestes subvencions.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	40%		☐
013	Estudiar la participació a les convocatòries que faci la Generalitat de Catalunya en el marc del nou programa de barris.	Des de la Gerència municipal s'ha fet una primera anàlisi de les condicions de la convocatòria, a partir de la informació disponible durant el primer semestre de 2025 i s'ha conclòs que caldrà esperar a la convocatòria formal per tal de verificar que el Masnou compleix amb els requisits que es determinin. Inicialment sembla que l'àmbit del Masnou Alt podria ser l'únic sector de municipi susceptible d'acollir-se a la convocatòria. Per altra banda, la Diputació de Barcelona oferirà suport per analitzar els possibles àmbits i projectes; l'Ajuntament valorarà demanar aquesta assistència.	01/2024	06/2027	01/2024		43%	10%		☐
046	Adquirir pisos per tal de resoldre casos d'emergència social per desnonaments a famílies o persones vulnerables.	El mes de juliol de 2024 es va completar l'adquisició de dos habitatges a la plaça de l'1 d'octubre, per destinar-los a casos d'emergència social. En data 3 de març de 2025, mitjançant Decret d'alcaldia número 732, es va formalitzar la cessió temporal temporal d'ambdós habitatges a la Fundació Privada Resilis, com a empresa adjudicatària del contracte de serveis de gestió integral del projecte Sostre 360º d'intervenció integral i comunitària d'atenció social a joves en situació de vulnerabilitat al carrer.	01/2025	12/2026	04/2024	07/2024	25%	100%		☐
